

Д **У** **И** **А** **М** **О**



Projektin tilanne

Tehty:


- vaatimusmäärittelyä korjattu
- testaussuunnitelmaa korjattu
- säikeistystä koodattu
- tiedostosta luku lisätty kotiagenttiin
- testausraportin pohjat laadittu
- testauksen viivästymisen vuoksi ollaan hieman aikataulusta jäljessä. Lisäksi dokumenttien viimeistely on hieman suunniteltua hitaampaa (esim. vaatimusmäärittely)

Projektin tilanne

Seuraavaksi:

- DHCP-aiheen viimeistely ja testaus
- vaatimusmäärittelyn viimeistely
- testaussuunnitelman viimeistely
- raporttien laatiminen

Ajankäyttö vaiheittain

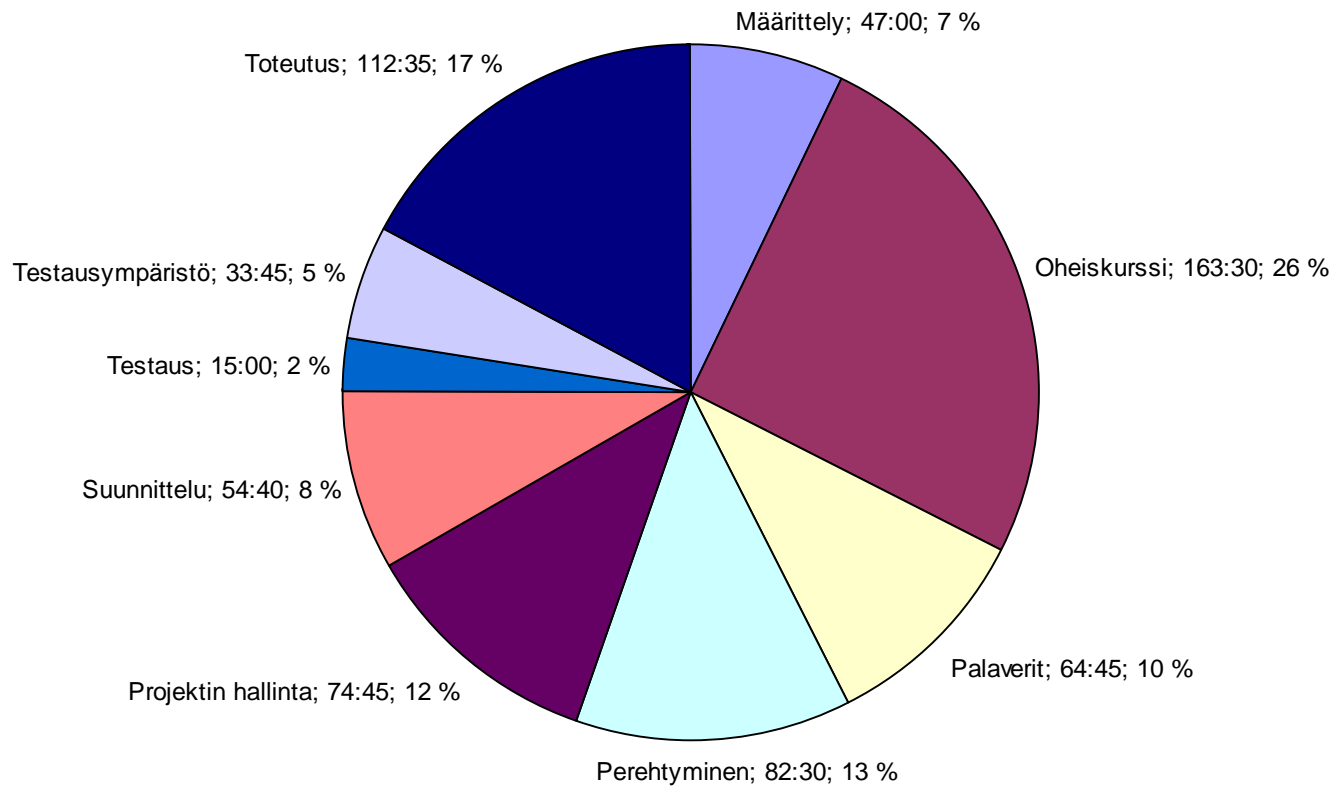

Vaihe	Antti Pyykkönen	Tero Hätinä	Joni Purojärvi	Yhteensä
Määrittely	6:00	11:00	30:00	47:00
Oheiskurssi	60:30	51:00	52:00	163:30
Palaverit	19:45	18:15	26:45	64:45
Perehtyminen	16:45	30:15	35:30	82:30
Projektin hallinta	54:00	14:45	6:00	74:45
Suunnittelu	13:00	23:30	18:10	54:40
Testaus	9:00		6:00	15:00
Testausympäristö	10:00	8:30	15:15	33:45
Toteutus	34:30	15:00	63:05	112:35
Yhteensä	223:30	172:15	252:45	648:30

Ajankäyttö viikoittain

