

Tilakatsaus

2. palaveri

17.2.2015

Kepler-projekti

Tehdyt toimenpiteet

- Työasemia asennettu käyttökuntoon
- Verkkolevyt ja sähköpostilistat perustettu
- Tehtävänjakoa : tuotettavien tulosten vastuuhenkilöt
 - Projektisuunnitelma (Joonas Konki)
 - Projektiraportti (Joonas Konki)
 - Sovellusraportti (Atte Rätty)
 - Vaatimusmäärittely (Henrik Paananen)
 - Järjestelmätestaus (Mikko Kuhno)
 - Käytettävyystestaus (Anu Koskela)
- Projektisuunnitelmaa ja vaatimusmäärittelyä aloitettu
- Erilaisiin kehitystyökaluihin ja sovelluskehyksiin tutustumista (Python/Java/JavaScript)
- Versiohallinta: YouSource-ryhmä ja repositorioita perustettu
- Tiedustelua muiden laitosten varausjärjestelmätarpeista


Tulevat toimenpiteet

- ❑ Projektisuunnitelman kirjoittaminen jatkuu
- ❑ Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- ❑ Käyttöliittymän suunnittelu ja toteuttaminen
- ❑ Kehitystyökalujen valinta ja niihin tutustuminen
- ❑ Koodaamisen aloitus!


Kohdattuja vaikeuksia

- ❑ Korppi-yhteistyön päätöksen odottelu viivästytti sovelluskehityksen aloittamista
- ❑ Projektille sopivia sovelluskehityksiä on useita ja taustatutkimus on vienyt aikaa
- ❑ Muiden laitosten tarpeet oltava tiedossa ennen tietokannan ja sovelluksen yleisen rakenteen tarkkaa suunnittelua

Ajankäyttö vaiheittain, viikot 5-7

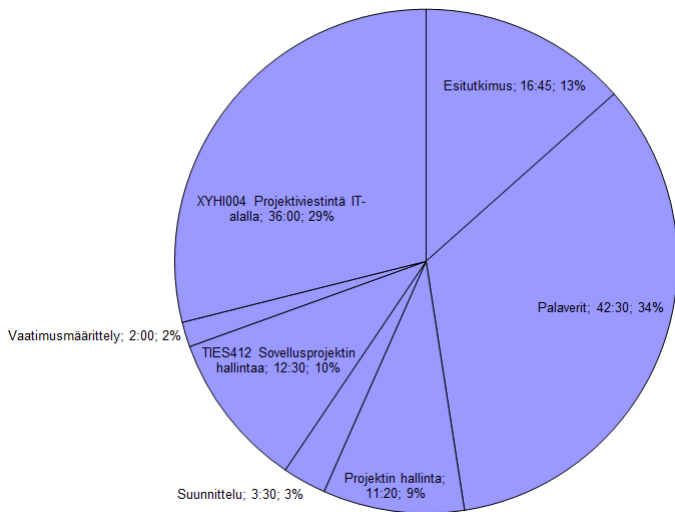

Ajankäyttö viikoittain, viikot 5-7

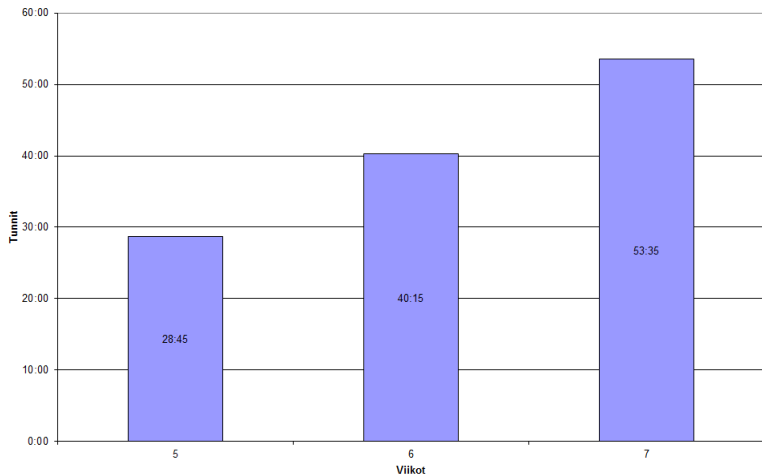

Ajankäyttö viikoittain

Viikko	IT	Joonas Konki	Anu Koskela	Mikko Kuhno	Henrik Paananen	Atte Rätty	Kaikki yhteensä
	5	5:30	5:30	5:30	5:30	6:45	28:45
	6	17:30	5:45	4:30	4:30	8:00	40:15
	7	15:45	8:15	7:15	13:30	8:50	53:35
Kaikki yhteensä		38:45	19:30	17:15	23:30	23:35	122:35
