

# TILAKATSAUS

---

Moveatis-projekti  
9 . palaveri



# Tehdyt toimenpiteet

- Järjestelmätestaus: Mac+Google Chrome, Iphone+Safari
  - 105 ominaisuutta
    - 34 toimi moitteettomasti
    - 61 toteuttamatonta toimintoa
      - (osa tehty, mutta ei viety palvelimelle)
    - 9 ominaisuutta ei toiminut halutusti (ongelmat korjattu)
      - Ei odottamattomia ongelmia, joita ei ollut tiedossa
- Toteutetut ominaisuudet
  - JYU-kirjautuminen
  - Tiedoston muodostaminen ja tallentaminen (loppusuoralla)
  - Hallintasivu valtaosin
  - Observoinnin nollaaminen, kielen valinta
  - Jarmo hionut ulkoasua ja kartoittanut viimeistelyn sisältöä

# Kohdatut ongelmatilanteet

- Pyhä kolmiyhteys aiheuttaa päänvaivaa
  - kategoriavalintasivu -> observointisivu -> yhteenvetosivu
  - Palvelinpuolen logiikka monimutkaisempi kuin osattiin odottaa
    - Sami ja Ilari hoitavat loppuun tällä viikolla
- Tiimalasi alkaa olla tyhjä

# Seuraavat toimenpiteet

- Ohjelmoidaan tällä viikolla
  - Toiminnallisuudet mahdollisimman hyvään toimintakuntoon
- Viimeistely
  - muokataan ulkoasu, varoitukset yms.


# Projektiryhmän jäsenten työtunnit

- Toteutuneet työtunnit tähän mennessä: **1313**
  - Ei sisällä oheiskurssien tunteja
- Suunniteltu panos: **1325**
  - 265 / jäsen
- Jäljellä: 12h (tiistaina päivällä)
  - Nyt mennään jo miinuksella


# Arvio työmäärästä

- Loput tehtävät ja arvio työmäärästä
  - Toteutettavat ominaisuudet: 50h
  - Projektiraportti: 10h
  - Sovellusraportti: 20h
  - Sovelluksen ja lähdekoodin viimeistely: 30h
  - Tulosten viimeistely ja kokoaminen: 10h
- Kokonaistyömäärä:  $1313(h) + 120(h) = 1533 \text{ h}$ 
  - $1533 / 5 / 26,5 = 11,569.. \sim 12 \text{ op}$
- Hoidetaan sovitut ominaisuudet loppuun, vaikka työtunteja kertyy suunniteltua enemmän

# Ajankäyttö vaiheittain

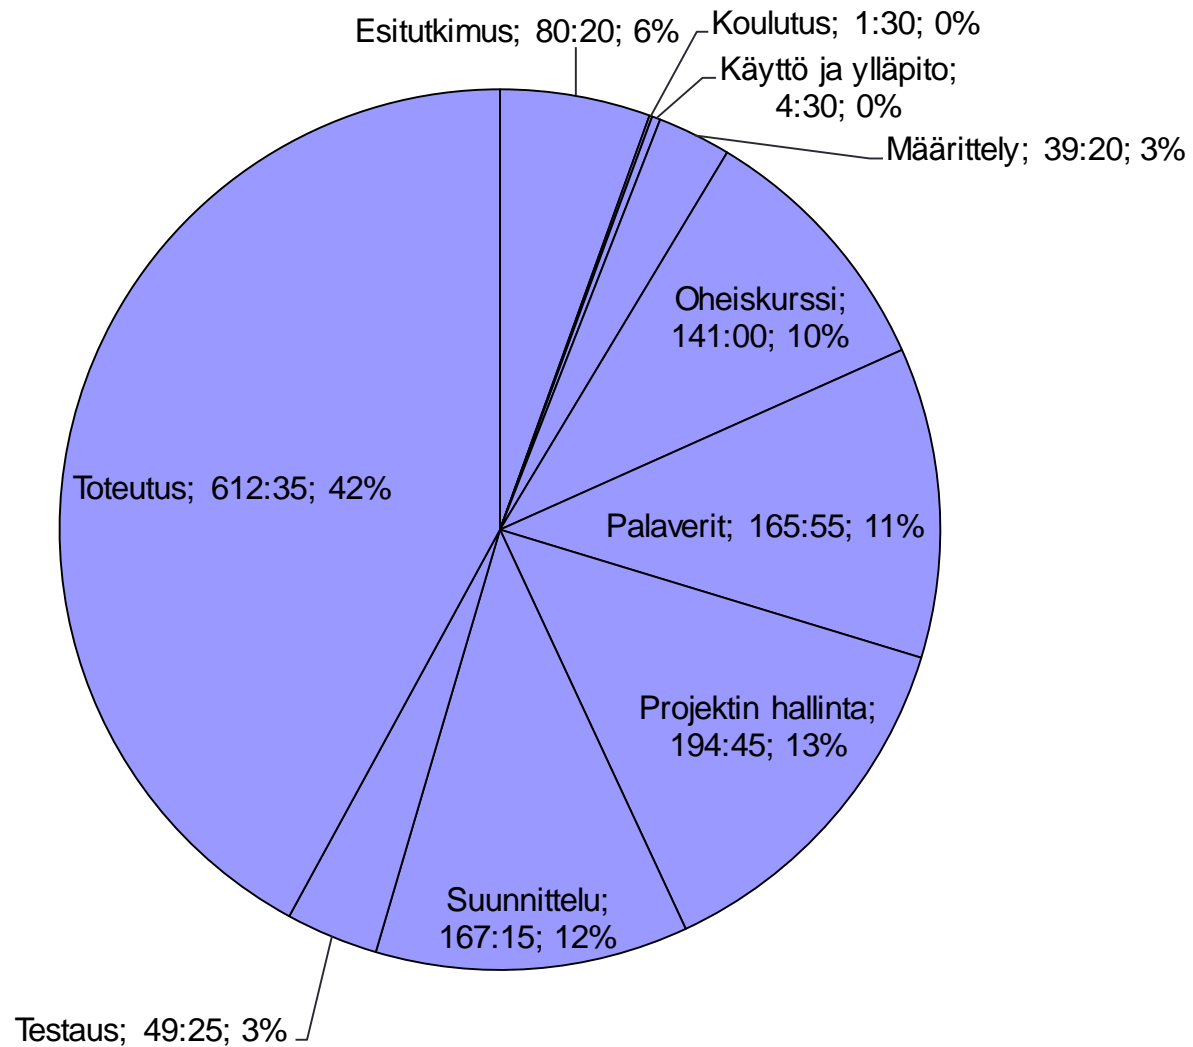

# Ajankäyttö viikoittain

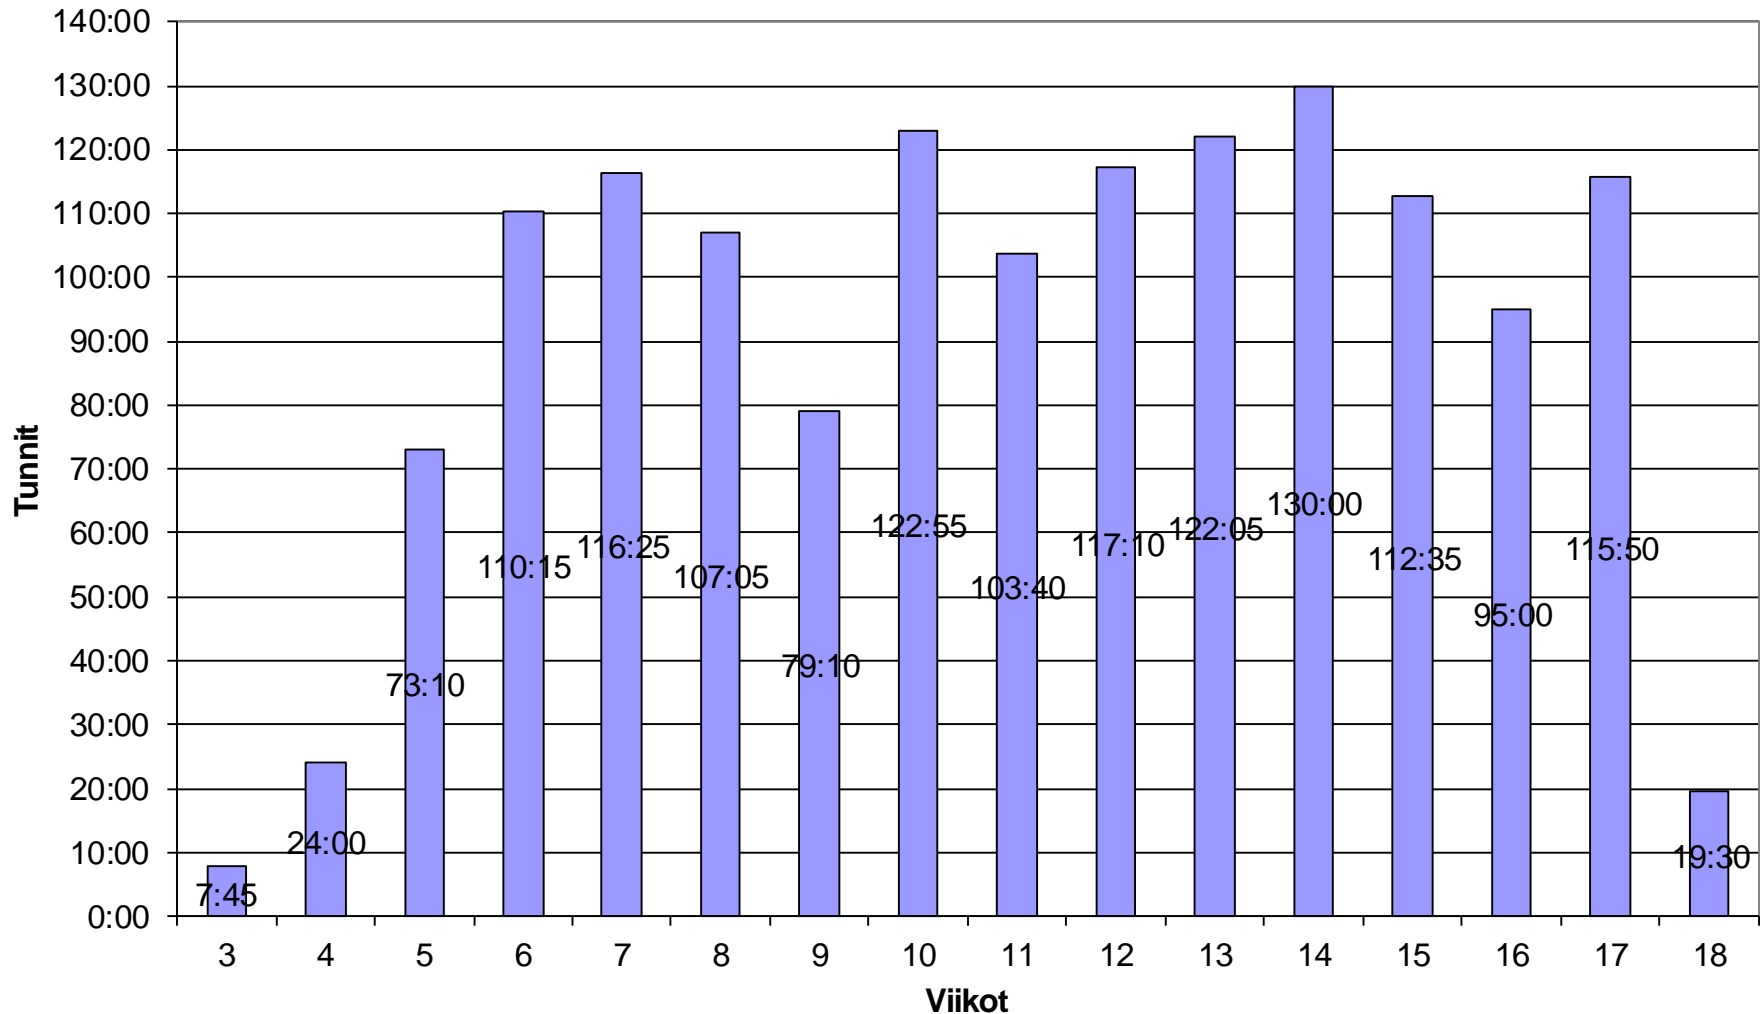



# Jäsenten työtunnit

Ajankäyttö	Tekijä						
Vaihe	Kai Korhonen	Sami Kallio	Ilari Paananen	Jarmo Juujärvi	Juha Moisio	Yhteensä	
Esitutkimus	6:30			24:15	28:05	21:30	80:20
Koulutus		1:30					1:30
Käyttö ja ylläpito	4:30						4:30
Määrittely			14:05			25:15	39:20
Palaverit	29:00	23:05	31:20	45:50		36:40	165:55
Projektin hallinta	156:00		37:45			1:00	194:45
Suunnittelu	28:00	26:45	49:05	9:10		54:15	167:15
Testaus	12:00		0:45	36:40			49:25
Toteutus	15:15	253:20	112:35	106:00		125:25	612:35
<b>Yhteensä</b>	<b>251:15</b>	<b>304:40</b>	<b>269:50</b>	<b>225:45</b>	<b>264:05</b>	<b>1315:35</b>	

- Ei sisällä oheiskurssien tunteja
- Kai ja Jarmo vastaavat tulosten viimeistelystä ym, jotta saadaan loppua kohti tasoiteltua tunteja
