

TILAKATSAUS

Potku-projekti

6. palaveri

2.4.2013

Tehdyt toimenpiteet

- Väliesittelyn kalvot on saatu valmiiksi.
- Arstilan analyysikomponentit on saatu toimimaan Linuxilla ja Windowsilla.
- Alkuaineiden poistumisen perustoiminnallisuus toteutettu.

Seuraavat toimenpiteet


- Kehitetään kalibrointi ja syvyysprofiili.
 - Kokonaisprosessi kuntoon!
 - Järjestelmättestaus.
- Projektisuunnitelma muokataan hyväksyttävään muotoon.

Kohdattuja ongelmia


- C-koodien kanssa oli ongelmia.
- Kalibrointi ja energiaspektri eivät ole täysin hallussa.

Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-13

Ajankäyttö vaiheittain

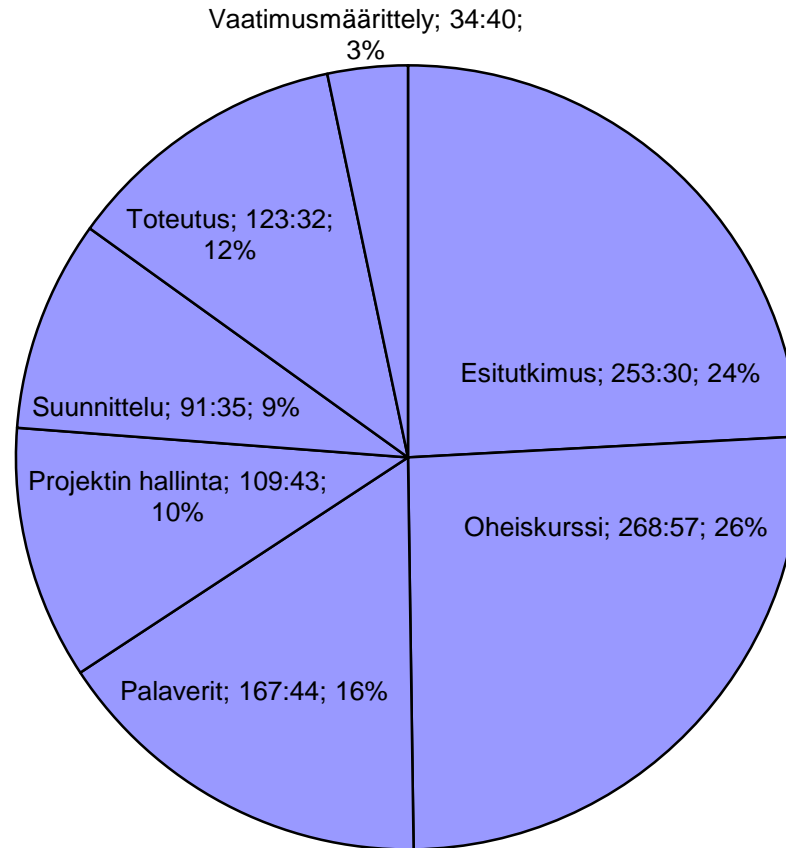

Ajankäyttö viikoittain

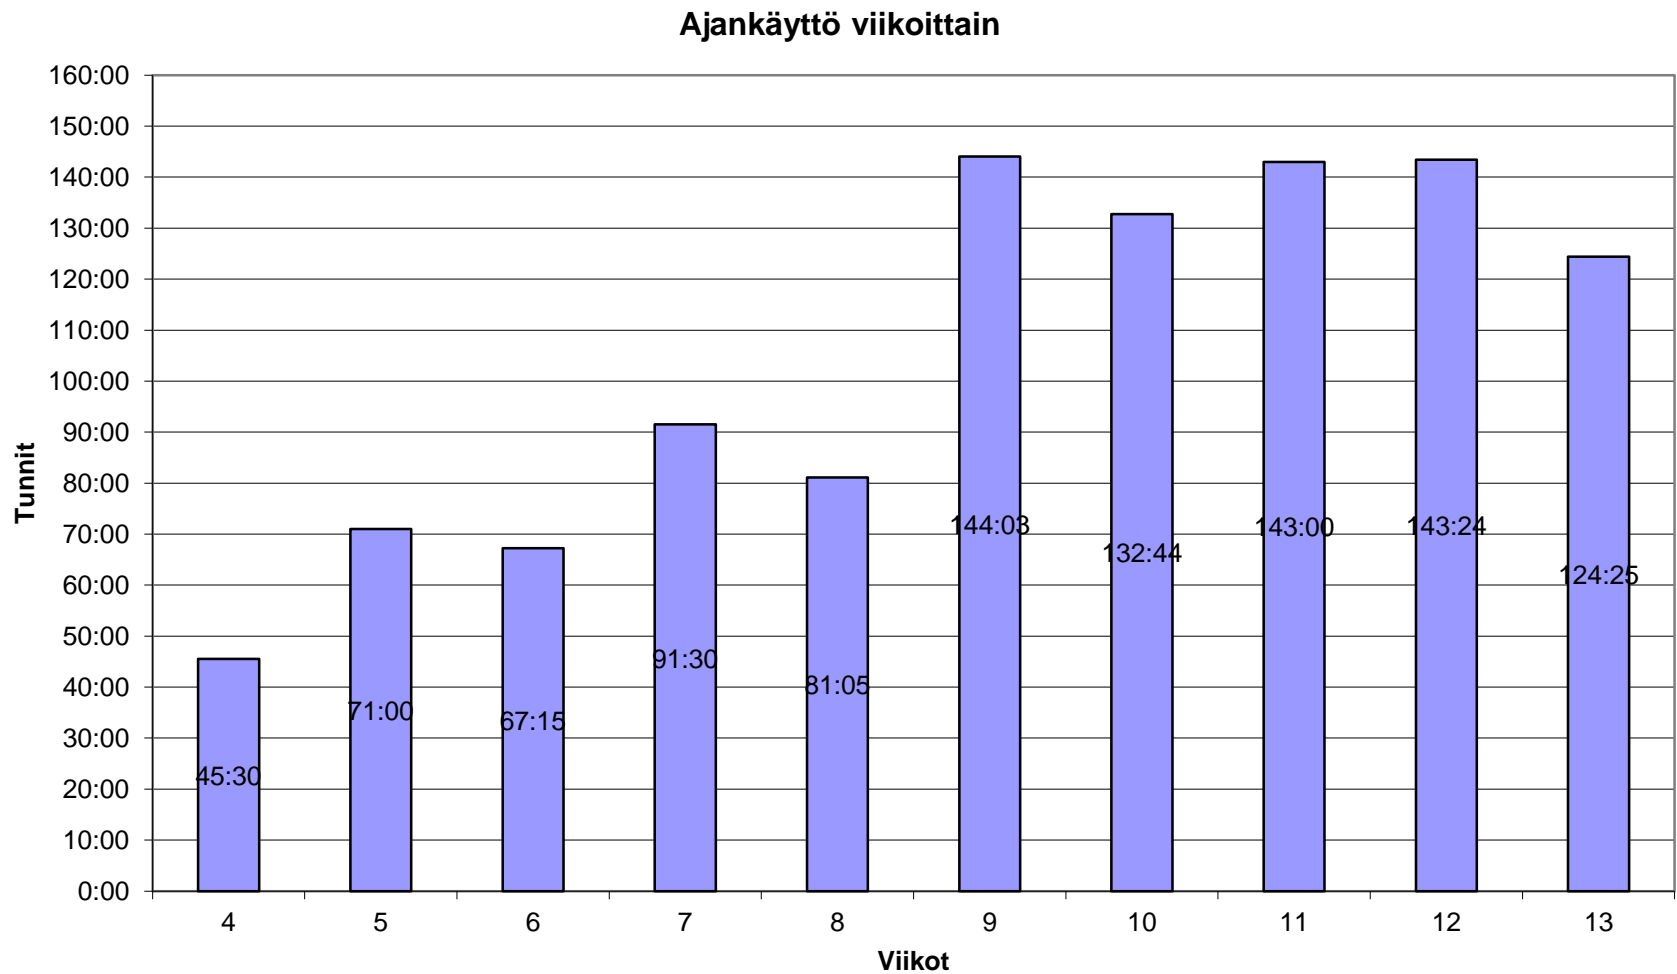

Ajankäyttö viikoittain

Aika	Tekijä					
Viikko	Kärkkäinen Samuli	Konu Timo	Raunio Miika	Aalto Jarkko	Rahkonen Samuli	Grand Total
4	7:00	7:00	4:00	9:30	18:00	45:30
5	12:30	12:30	20:00	15:00	11:00	71:00
6	12:00	15:00	10:00	7:15	23:00	67:15
7	16:00	21:30	18:30	13:30	22:00	91:30
8	10:00	30:50	14:00	11:30	14:45	81:05
9	29:40	28:53	25:30	31:15	28:45	144:03
10	21:40	35:21	24:00	29:00	22:43	132:44
11	24:25	35:24	28:15	27:00	27:56	143:00
12	33:30	28:55	27:30	28:50	24:39	143:24
13	19:25	24:35	23:25	26:15	30:45	124:25
Grand Total	186:10	239:58	195:10	199:05	223:33	1043:56
