

Tilakatsaus 1.5.2018

Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 18.4. pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan tehdyt projektiryhmän yhteiset tehtävät ja erikseen myös tehtävät, jotka jokainen jäsen on tehnyt itsenäisesti yhteisten tehtävien lisäksi.

Kaikki jäsenet

Projektiryhmän kaikki jäsenet ovat

- osallistuneet toiseen väliesittelyyn,
- suunnitelleet projektin tulosten aikataulun.

Leinonen

Leinonen on

- työstänyt toiminnallisten testauksen suunnitelmaa,
- työstänyt taulukkoliitännäistä ja graafista taulukkoeditoria.

Lindholm

Lindholm on

- työstänyt taulukkoliitännäistä,
- työstänyt graafista taulukkoeditoria,
- laatinut toisen väliesittelyn muistion,
- laatinut 9. palaverin esityslistan.

Naukkarinen

Naukkarinen on

- työstänyt taulukkoliitännäisen toimintoa, joka muuttaa liitännäisen taulukon LaTeX-taulukoksi,
- laatinut käyttöohjeet liitetoiminnoille,
- laatinut kehittäjän ohjeet liitetoiminnoille.

Pasanen

Pasanen on

- aloittanut sovellusraportin kirjoittamisen,
- aloittanut projektiraportin kirjoittamisen,
- toteuttanut palvelintestejä pöytäkirjaototeinnolla ja kokouskutsusta pöytäkirjaksi -muuntimelle,

- dokumentoinut pöytäkirjaotetoiminnon teknisen toteutuksen,
- dokumentoinut kokouskutsusta pöytäkirjaksi -muuntimen teknisen toteutuksen,
- työstänyt graafista taulukkoeditoria.

Stylman

Stylman on

- laatinut 8. palaverin pöytäkirjan,
- suunnitellut käyttöohjeita,
- jatkanut käytettävyydestauksen suunnitelman laatimista,
- parantanut liitteiden yhdistämisen koodia,
- lisännyt Cancel -painikkeen liitteiden yhdistämisen käyttöliittymään,
- työstänyt vaatimusmäärittelydokumenttia,
- toteuttanut kokousdokumenttien preambleen painikkeen asiakohdan läsnäolotaulukon lisäämiseksi.

Projektin tulokset

Luvussa luetellaan projektin tulosten tilat.

Toiminnot:

- graafinen taulukkoeditori on kesken,
- kokouskutsusta pöytäkirjaksi -muunnin on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toteutus on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen integroiminen TIMiin on valmis,
- pöytäkirjaotteiden luomistoiminto on valmis,
- taulukkomuodon suunnittelu on valmis,
- taulukkoliitännäisen toteutus on kesken,
- asiakohdan läsnäolotaulukon lisäävä painike on alustavasti valmis.

Testaus:

- käytettävyydestauksen suunnitelma on kesken,
- toiminnallisen testauksen suunnitelma on kesken.


Dokumentit:

- käyttöohjeet on kesken,
- projektiraportti on kesken,
- projektisuunnitelma on valmis,
- sovellusraportti on kesken,
- vaatimusmäärittely on kesken.

Ajankäyttö


Luvun graafit ja taulukko esittävät projektiryhmän työtunnit koko aikajänteeltä. Viikolta 18 mukaan sisältyvät vain maanantain tunnit.

Ajankäyttö vaiheittain

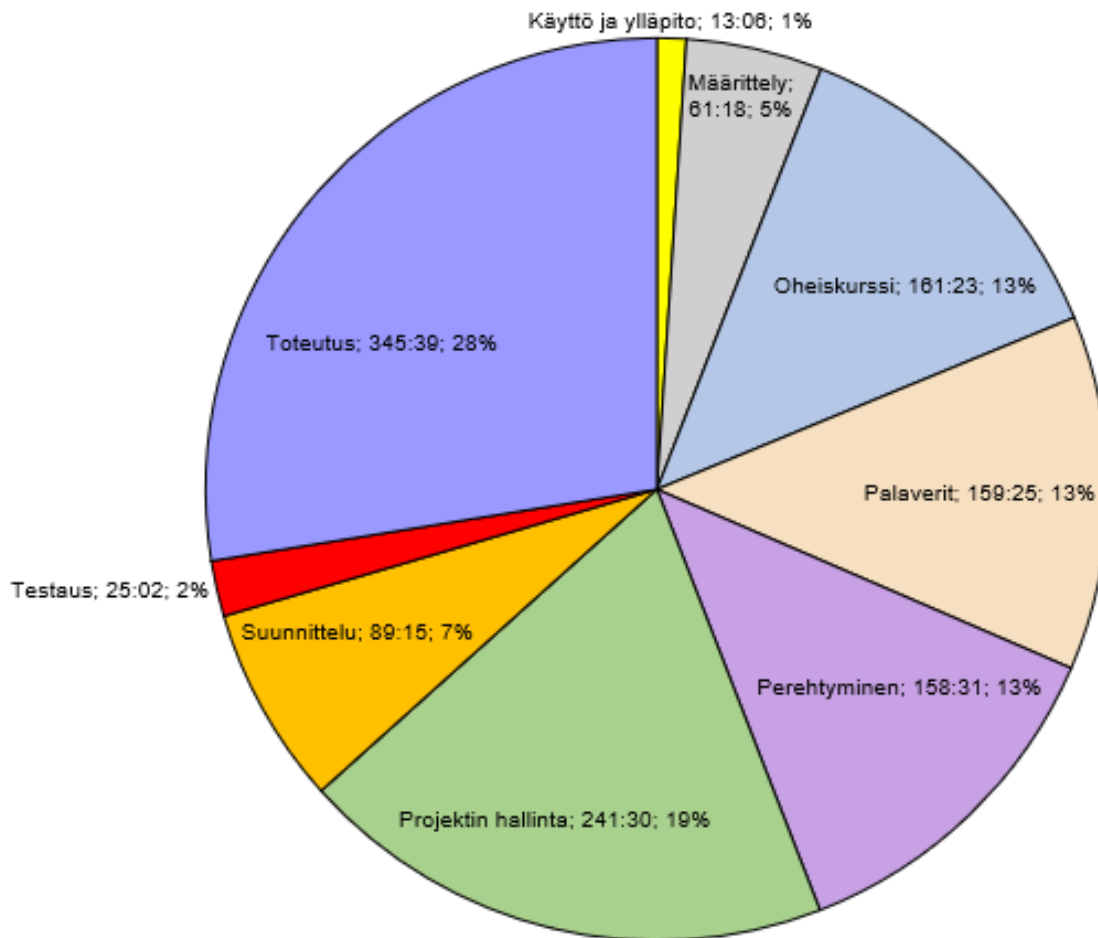

Ajankäyttö	Tekijä					
Vaihe	Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Käyttö ja ylläpito		3:30		1:51	7:45	13:06
Määrittely	1:05	58:43	1:30			61:18
Oheiskurssi	43:00	37:15	26:25	35:05	19:38	161:23
Palaverit	28:20	34:05	32:36	36:29	27:55	159:25
Perehtyminen	16:15	40:53	52:13	10:11	38:59	158:31
Projektin hallinta	115:25	37:05	25:55	23:30	39:35	241:30
Suunnittelu	7:50	14:55	11:05	23:31	31:54	89:15
Testaus	0:10	10:22	14:05		0:25	25:02
Toteutus	40:00	39:28	77:37	113:33	75:01	345:39
Yhteensä	252:05	276:16	241:26	244:10	241:12	1255:09

Työtunnit viikoittain

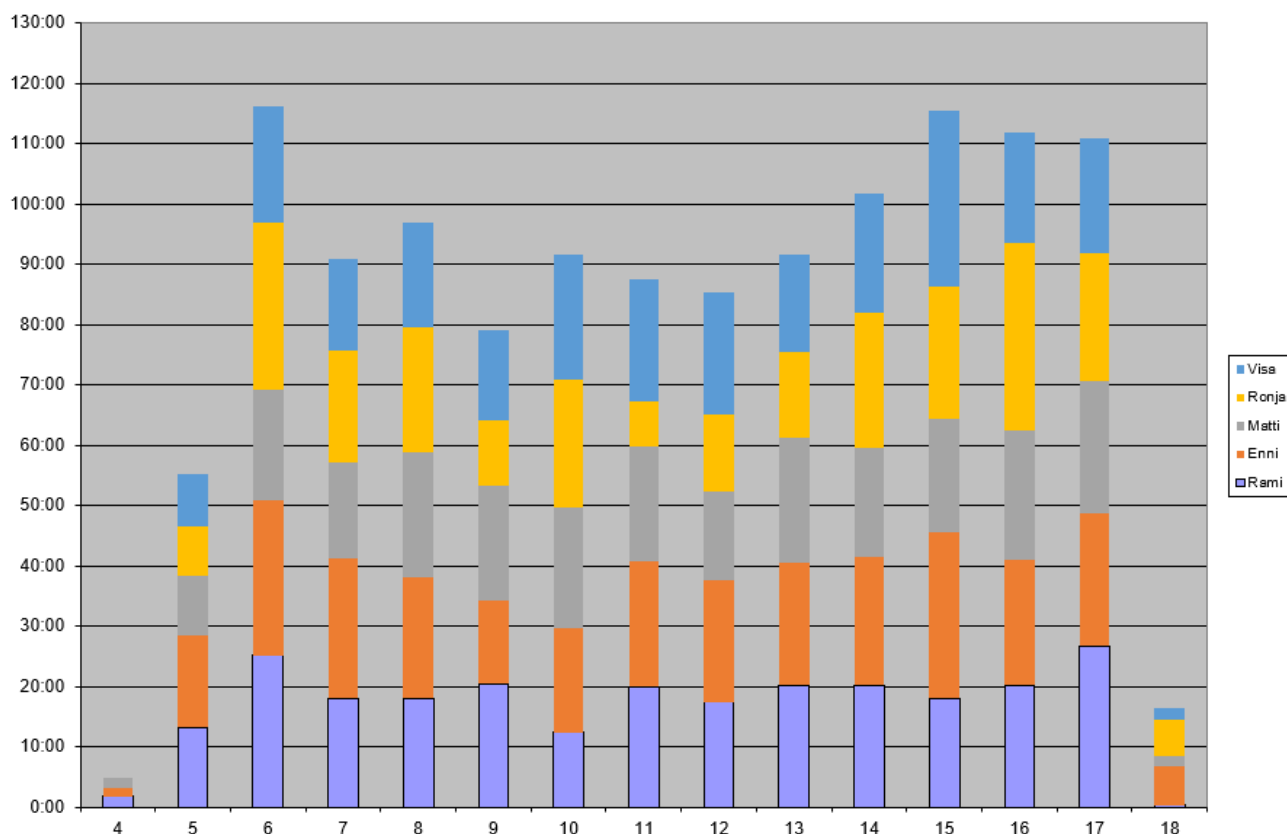

Tulosten ja tehtävien aikataulu

Projektin keskeneräisten ja aloittamattomien tulosten suunniteltu toteutusaikataulu on seuraavanlainen:

- taulukkoliitännäinen: 14.5.
 - LaTeX-tilukko-muunnos: 7.5.
- graafinen taulukkoeditori: 14.5.
- vaatimusmäärittely: 21.5.
- käyttöohjeet: 21.5.
 - tiedekuntaneuvoston käyttöohje: 21.5.
 - graafisen taulukkoeditorin käyttöohje: 14.5.
 - liiteohjeet: alustavasti valmis
- dokumentaatio / jatkokehittäjän ohjeet:
 - taulukko: 21.5.
 - liitteet: 11.5.
- käytettävyytestaus:
 - alustava suunnitelma 30.4.
 - raportti 21.5.
- toiminnallinen testaus:
 - alustava suunnitelma 30.4.
 - raportti 21.5.
- sovellusraportti: 25.5.
- projektiraportti: 31.5.

Tulokset voivat valmistua myös ennen suunniteltua päivämäärää.

Alkuperäinen suunniteltu aikataulu on esillä projektisuunnitelmassa osoitteessa

<https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/proj/2018/titus/dokumentit/projektisuunnitelma#aika>

Alkuperäiseen suunniteltuun aikatauluun verrattuna taulukkoliitäntäinen ja graafinen taulukkoeditori ovat valmistumassa myöhemmin. Myös sekä toiminnallinen testaus että käytettyystestaus suoritetaan myöhemmin, osittain koska graafisen taulukkoeditorin halutaan olevan lähellä valmista ennen testausta. Suunnitelmassa on myös otettu käyttöön projektille toukokuun loppuun varattu puolentoista viikon pelivara. Projektin uskotaan päättyvän toukokuun lopussa.

Työtunneissa mitattuna projektiryhmä on kokonaisuudessaan tehnyt viikoilla 6-17 noin 1180 työtuntia. Yhteenlaskettu tavoite kyseisiltä viikoilta on 1200 tuntia. Siten projektiryhmä on työtuntitavoitteeseen nähden jäljessä noin 20 tuntia.

Projektin läpivientä estävät tai hidastavat seikat

Projektin läpiviennissä ei tällä hetkellä ole erityisiä estäviä tai hidastavia seikkoja.

Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Projektin etenemiseksi tulee päättää, mitkä vaatimukset projektiryhmä vielä toteuttaa ja mitkä jätetään mahdollisille jatkokehittäjille tai muuten vain toteuttamatta.
