

# Tilakatsaus 8.5.2018

## Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 2.5. pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan tehdyt projektiryhmän yhteiset tehtävät ja erikseen myös tehtävät, jotka jokainen jäsen on tehnyt itsenäisesti yhteisten tehtävien lisäksi.

### Kaikki jäsenet

Projektiryhmällä ei ole ollut merkittäviä yhteisiä tehtäviä edellisen palaverin jälkeen.

### Leinonen

Leinonen on

- työstänyt toiminnallisten testauksen suunnitelmaa,
- auttanut Naukkarista testaamaan taulukkoliitännäisen LaTeX-muunnoksen toimivuutta,
- työstänyt graafista taulukkoeditoria.

### Lindholm

Lindholm on

- laatinut 9. palaverin pöytäkirjan,
- työstänyt taulukkoeditoria,
- laatinut taulukkoliitännäisen käyttöohjeita.

### Naukkarinen

Naukkarinen on

- työstänyt taulukkoliitännäisen toimintoa, joka muuttaa liitännäisen taulukon LaTeX-taulukoksi,
- työstänyt käyttöohjeita.

### Pasanen

Pasanen on

- työstänyt taulukkoliitännäistä ja taulukkoeditoria,
- yhtenäistänyt kokousdokumenttien toimintojen käyttämiä makroja,
- kirjoittanut sovellusraporttia,
- kirjoittanut projektiraporttia.

## Stylman

Stylman on

- työstänyt vaatimusmäärittelydokumenttia,
- työstänyt projektin testaussuunnitelmaa,
- työstänyt käytettävyydestauksen suunnitelmaa,
- laatinut pohjan käytettävyydestauksen testausraportille,
- parannellut 8. palaverin pöytäkirjaa.

## Projektin tulokset

Luvussa luetellaan projektin tulosten tilat.

Toiminnot:

- graafinen taulukkoeditori on kesken,
- kokouskutsusta pöytäkirjaksi -muunnin on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toteutus on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen integroiminen TIMiin on valmis,
- pöytäkirjoitteiden luomistoiminto on valmis,
- taulukkomuodon suunnittelu on valmis,
- taulukkoliitännäisen toteutus on kesken,
- asiakohdan läsnäolotaulukon lisäävä painike on kesken.

Testaus:


- käytettävyydestauksen suunnitelma on kesken,
- toiminnallisen testauksen suunnitelma on kesken.

Dokumentit:


- käyttöohjeet on kesken,
- projektiraportti on kesken,
- projektisuunnitelma on valmis,
- sovellusraportti on kesken,
- vaatimusmäärittely on kesken.

## Ajankäyttö

Luvun graafit ja taulukko esittävät projektiryhmän työtunnit koko aikajänteeltä. Viikolta 19 mukaan sisältyvät vain maanantain tunnit.

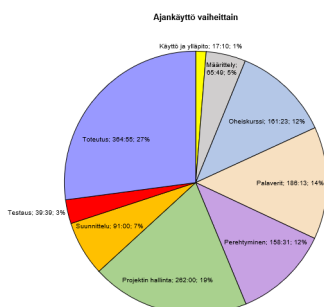

Ajankäyttö	Tekijä					
Vaihe	Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Käyttö ja ylläpito			3:30		10:30	17:10
Määrittely	1:10	62:54	1:30		0:15	65:49
Oheiskurssi	43:00	37:15	26:25	35:05	19:38	161:23
Palaverit	32:30	35:25	36:26	49:14	32:38	186:13
Parehtyminen	16:15	40:53	52:13	10:11	38:59	158:31
Projektin hallinta	130:10	39:14	26:24	23:30	42:42	262:00
Suunnittelu	7:50	14:55	11:05	24:01	33:09	91:00
Testaus	6:40	14:09	23:45		1:05	39:39
Toteutus	46:05	39:46	83:53	115:53	79:18	364:55
<b>Yhteensä</b>	<b>277:40</b>	<b>288:01</b>	<b>261:41</b>	<b>261:04</b>	<b>258:14</b>	<b>1346:40</b>

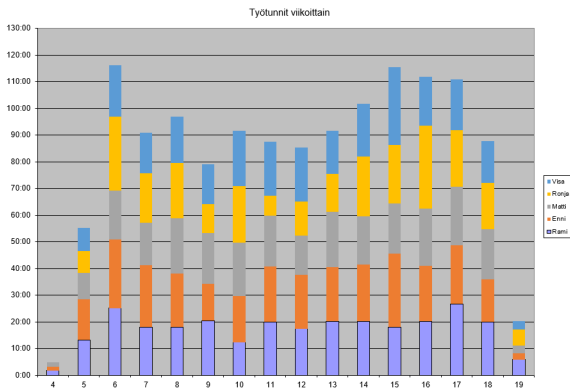

## Tulosten ja tehtävien aikataulu

Projektin keskeneräisten ja aloittamattomien tulosten suunniteltu toteutusaikataulu on seuraavanlainen:

- taulukkoliitännäinen: 14.5.
  - LaTeX-tilukko-muunnos: 7.5.
- graafinen taulukkoeditori: 14.5.
- vaatimusmäärittely: 21.5.
- käyttöohjeet: 21.5.
  - tiedekuntaneuvoston käyttöohje: 21.5.
  - graafisen taulukkoeditorin käyttöohje: 14.5.
  - liiteohjeet: alustavasti valmis
- dokumentaatio / jatkokehittäjän ohjeet:
  - taulukko: 21.5.
  - liitteet: 11.5.
- käytettävyytestaus:
  - alustava suunnitelma 30.4.
  - raportti 21.5.
- toiminnallinen testaus:
  - alustava suunnitelma 30.4.
  - raportti 21.5.
- sovellusraportti: 25.5.
- projektiraportti: 31.5.

Tulokset voivat valmistua myös ennen suunniteltua päivämäärää.

Alkuperäinen suunniteltu aikataulu on esillä projektisuunnitelmassa osoitteessa

<https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/proj/2018/titus/dokumentit/projektisuunnitelma#aikat>

Alkuperäiseen suunniteltuun aikatauluun verrattuna taulukkoliitännäinen ja taulukkoeditori ovat valmistumassa myöhemmin. Myös sekä toiminnallinen testaus että käytettävyytestaus suoritetaan myöhemmin, osittain koska taulukkoeditorin halutaan olevan lähellä valmista ennen testausta. Suunnitelmassa on myös otettu käyttöön projektille toukokuun loppuun varattu puolentoista viikon pelivara. Projektin uskotaan päättyvän toukokuun lopussa.

Työtunneissa mitattuna projektiryhmä on kokonaisuudessaan tehnyt viikoilla 6-18 noin 1270 työtuntia. Yhteenlaskettu tavoite kyseisiltä viikoilta on 1300 tuntia. Siten projektiryhmä on työtuntitavoitteeseen nähden jäljessä noin 30 tuntia.

### **Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat**

Projektin läpiviennissä ei tällä hetkellä ole erityisiä estäviä tai hidastavia seikkoja.

### **Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?**

Projektiorganisaation tulee päättää käytettävyydestä suoritettavien henkilöiden ja testausaikataulusta.
