

# Tilakatsaus viikko 13

Groundhog

Ti 30.3.2021

# Tehdyt toimenpiteet

## Dokumentit

- Projektisuunnitelma 0.3.0
- Käyttöliittymä-suunnitelma 0.3.0
- Projektisopimukset tulostettu

## Ohjelma

- Ikkunoitu käyttöliittymä.
- Tiedoston lukeminen kuvapinosta.

# Seuraavat toimenpiteet

Jatketaan tiedoston luvun toteuttamista


- Image sequence, image stack, 3D-tiff ja RAW-tiedostot.

Jatketaan käyttöliittymän toteuttamista.

- Menu-valikko.

Huhtikuun tavoitteiden asettaminen päivien tarkkuudella.


# Ajankäyttö vaiheittain

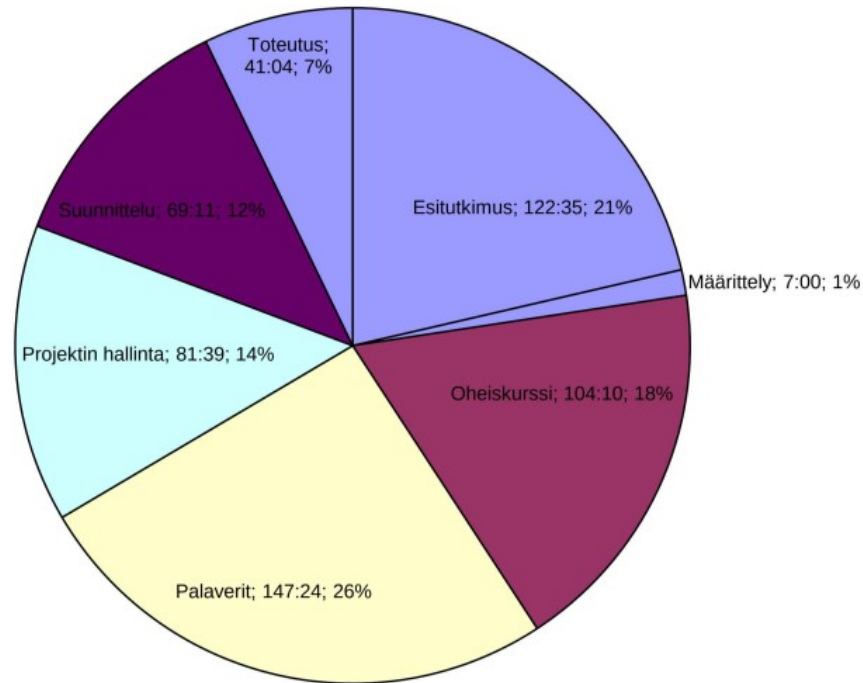



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

Viikko		(Kaikki)			
Ajankäyttö	Tekijä				
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä
Esitutkimus	35:45	19:15	34:35	33:00	122:35
Määrittely		7:00			7:00
Oheiskurssi	26:50	28:30	21:35	27:15	104:10
Palaverit	36:55	40:10	27:25	42:54	147:24
Projektin hallinta	18:05	11:55	13:55	37:44	81:39
Suunnittelu	3:30	20:30	2:00	43:11	69:11
Toteutus	10:50	10:15		19:59	41:04
<b>Yhteensä</b>	<b>131:55</b>	<b>137:35</b>	<b>99:30</b>	<b>204:03</b>	<b>573:03</b>

# Ajankäyttö viikottain

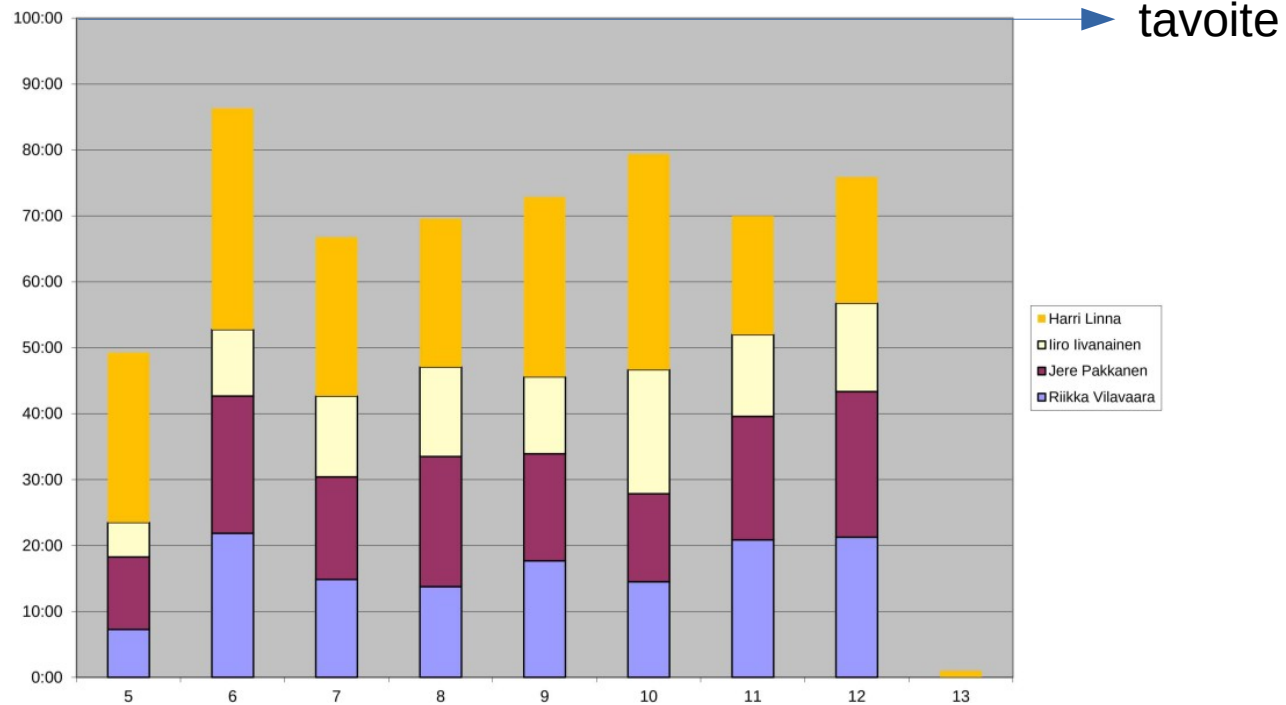

# Projektiaikataulu

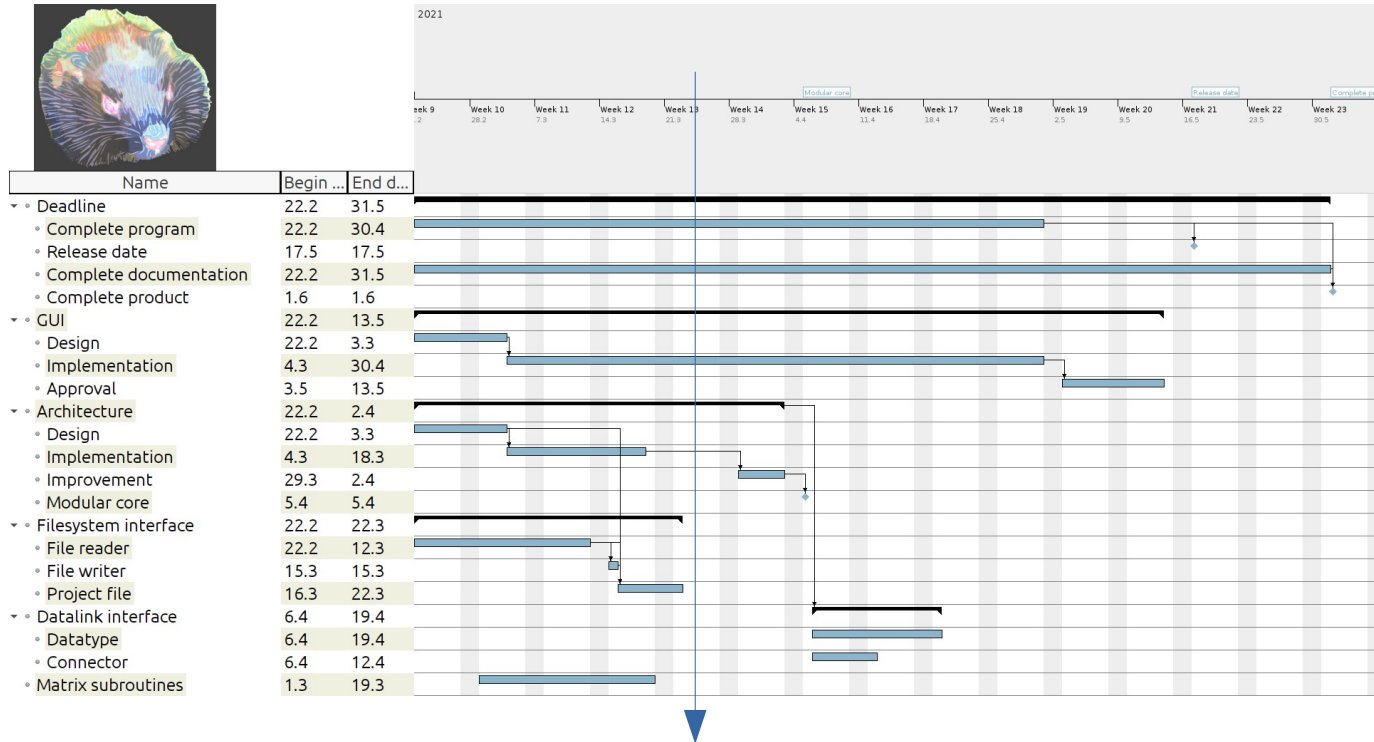

# Projektiaikataulu

**Aikataulussa.** Käyttöliittymän toteutus suunniteltiin viikoille 11–18. Kahden viikon aikana toteutettiin suunnitelman mukainen ikkunointi.

**Aikataulussa.** Tiedostojen käsittelyyn varattiin kuukausi (4 viikkoa), joista on käytetty yksi. Kolme lukemiseen ja yksi kirjoittamiseen. Aikataulu sisältää suunnittelun ja toteutuksen.

**Myöhässä.** Arkkitehtuurin eli luokkarakenteen toteuttaminen suunniteltiin aloitettavan viikolla 11, mutta on vielä aloittamatta.
