

Tilakatsaus viikko 20

Groundhog

Ti 18.5.2021

Tehdyt toimenpiteet

Dokumentit

- Vaatimusmäärittely
0.4.0
- Projektisuunnitelma
0.5.0

Ohjelma

- Liitetyt datapisteet näkyvät kartalla ja niitä voi klikata.
- Teksti- ja kuvatiedostot avautuvat valittaessa liitosdataa.

Seuraavat toimenpiteet

Tekstitiedoston avaaminen AvalonEditorissa.

Taulukoiden lukeminen ExcelDataReaderilla.

Tilan tallentamisen ja lataamisen jatkaminen.

Liitetyn datan hallinnan jatkaminen.

Metatietojen jatkaminen.

Aiemmin suunnitellut toimenpiteet

Tehty. Ensimmäinen prototyyppi palaveriin 18.5 mennessä.

Tehty. Seuraava versio vaatimusmäärittelystä.

Kesken. Sovelluksen tilan tallentamisen jatkaminen.

Tehty. Tekstitiedoston näyttäminen.

Kohdattuja ongelmia

Liitosdatan tallentamisessa ja lataamisessa havaittiin ongelma.


- Näytteen tallentamisen ja lataamisen aikana katoaa tietoa.

Aiemmin kohdattuja ongelmia

Ratkaistu raw-tiedoston lukemisen ongelma.

Ratkaisematta. Magick.NET kokorajoitukset tulevat vastaan lukiessa suuria tiedostoja (BigTiff).


Ajankäyttö vaiheittain

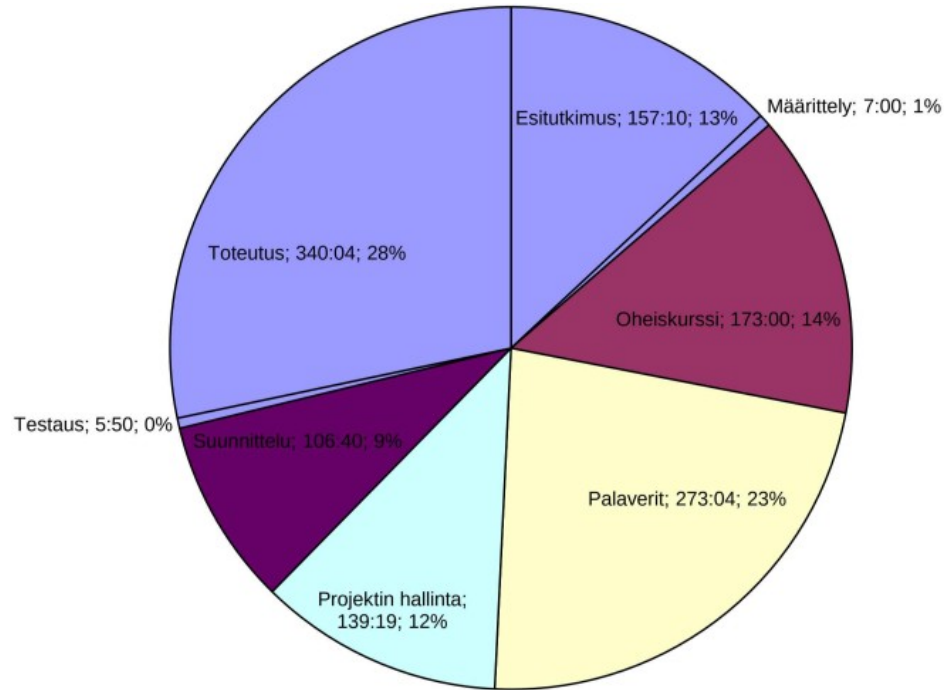


Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

Viikko		(Kaikki)			
Ajankäyttö	Tekijä				
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä
Esitutkimus	37:15	26:45	60:10	33:00	157:10
Määrittely		7:00			7:00
Oheiskurssi	44:10	43:45	33:00	52:05	173:00
Palaverit	70:45	75:10	55:45	71:24	273:04
Projektin hallinta	38:45	18:40	29:50	52:04	139:19
Suunnittelu	8:20	32:30	3:00	62:50	106:40
Testaus			5:50		5:50
Toteutus	78:20	98:05	62:10	101:29	340:04
Yhteensä	277:35	301:55	249:45	372:52	1202:07

Ajankäyttö viikoittain

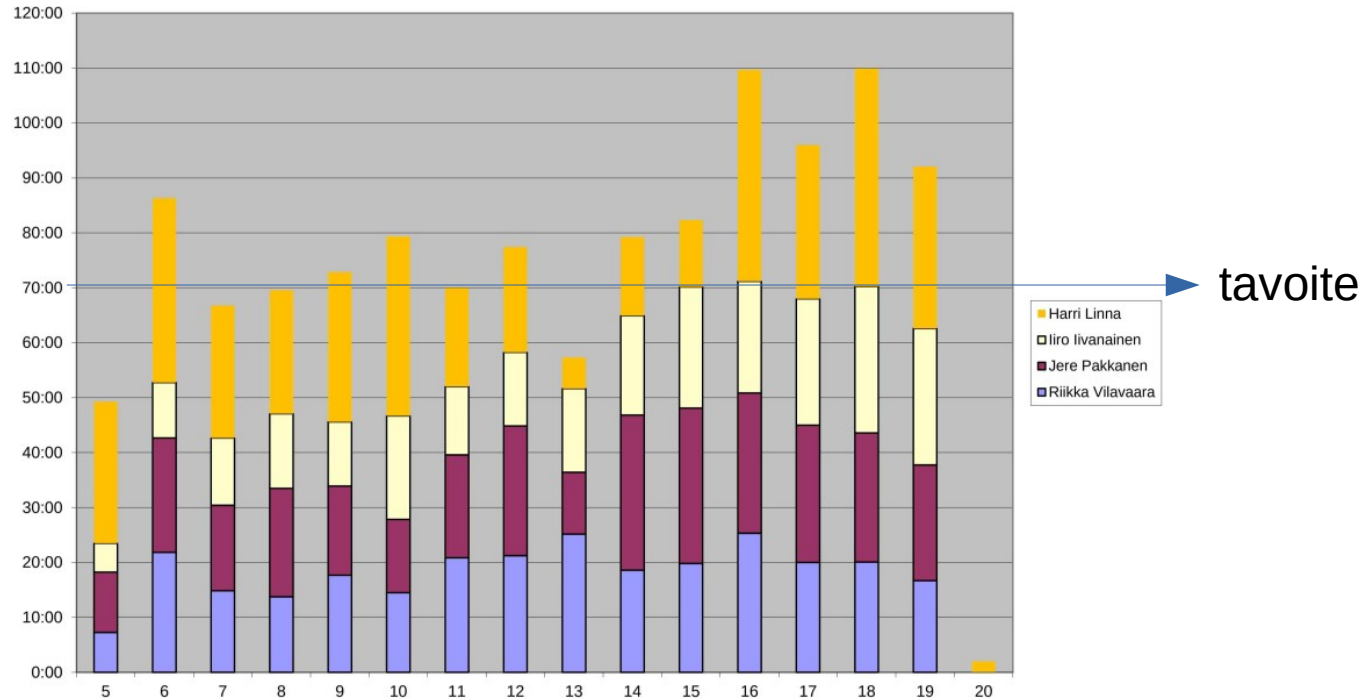

Projektiaikataulu

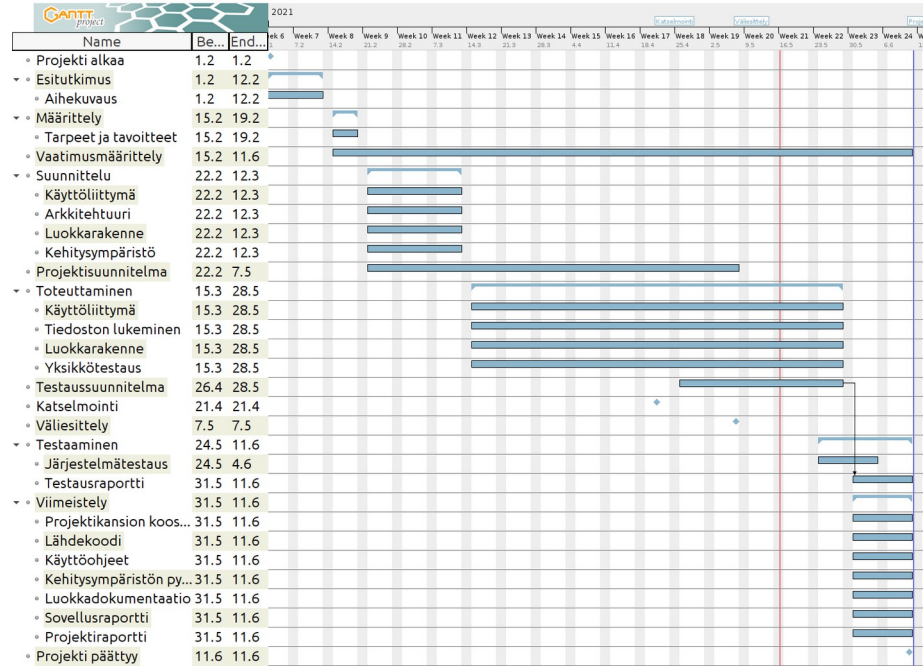

Projektiaikataulu

Testausvaiheeseen siirrytään 28.5.

- Ke 19.5 pakolliset ja tärkeät vaatimukset jaetaan tehtäviksi Trelloon.
- Jokaiselle toteutettavalle vaatimukselle määrätään vastuuhenkilö.

Dokumenttien suunniteltu takaraja on 11.6.

- Testaussuunnitelman laatiminen on aloitettu.
