

Tilakatsaus viikko 24

Groundhog

Ma 14.6.2021

Tehdyt toimenpiteet

Dokumentit

- Testaussuunitelma
0.1.0
- Vaatimusmäärittely
0.4.5

Ohjelma

- Tiedostopolkujen relatiivinen tallentaminen näytteeseen nähden.
- Harmaasävyskaalan liukusäätimet lisättiin.
- Generoitujen karttapinojen poistamisen kysyminen ennen ohjelman sulkemista.

Seuraavat toimenpiteet

Vaatimusmäärittely 0.5.0

Konfiguraatiodialogi asetuksille

- käyttäjänimi ja pääakselien värit.

Pikanäppäimet menuvalikon toimintoihin.

About-ikkunaan tietoa ohjelmasta

- ohjelman nimi ja
- versionumero tai päivämäärä.

Lähdekoodin muotoilua

- rivipituuden 80–90 rajoittaminen ja
- lisenssin lisääminen tiedostojen alkuun.

Aiemmin suunnitellut toimenpiteet

Kesken. Koodikatselmoinnissa ehdotettujen muutosten toteuttaminen.

Tehty. Säikeistyksen tulosten synkronointi.

Tehty. Uuden näytteen tekeminen.


Tehty. Relatiivisten polkujen käyttäminen esimerkiksi siirrettäessä ohjelmaa tietokoneelta toiselle.

Tehty. Stackien poistaminen suljettaessa ohjelma.

Kohdattuja ongelmia

Karttapinojen poistaminen kuvasiivujen tapauksessa kestää arviolta 400 kuvalla noin 10 sekuntia.


Ajankäyttö vaiheittain

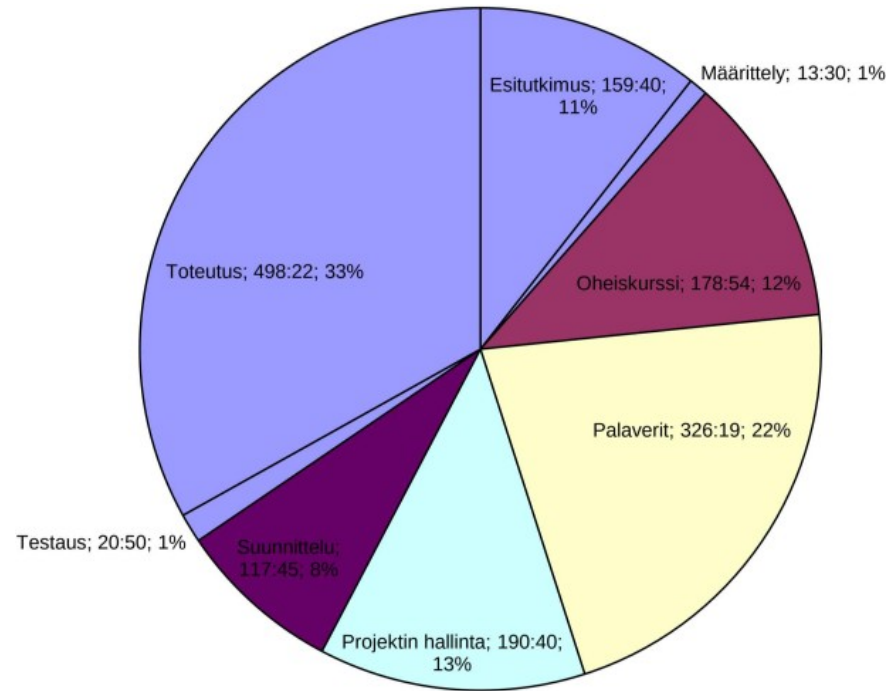


Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

Viikko		(Kaikki)				
Ajankäyttö	Tekijä					
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä	
Esitutkimus	37:15	28:15	61:10	33:00	159:40	
Määrittely		7:00		6:30	13:30	
Oheiskurssi	47:20	45:14	34:15	52:05	178:54	
Palaverit	82:00	92:25	69:30	82:24	326:19	
Projektin hallinta	56:30	24:39	36:45	72:46	190:40	
Suunnittelu	12:25	37:00	3:00	65:20	117:45	
Testaus			20:50		20:50	
Toteutus	129:00	159:43	108:10	101:29	498:22	
Yhteensä	364:30	394:16	333:40	413:34	1506:00	

Ajankäyttö viikoittain

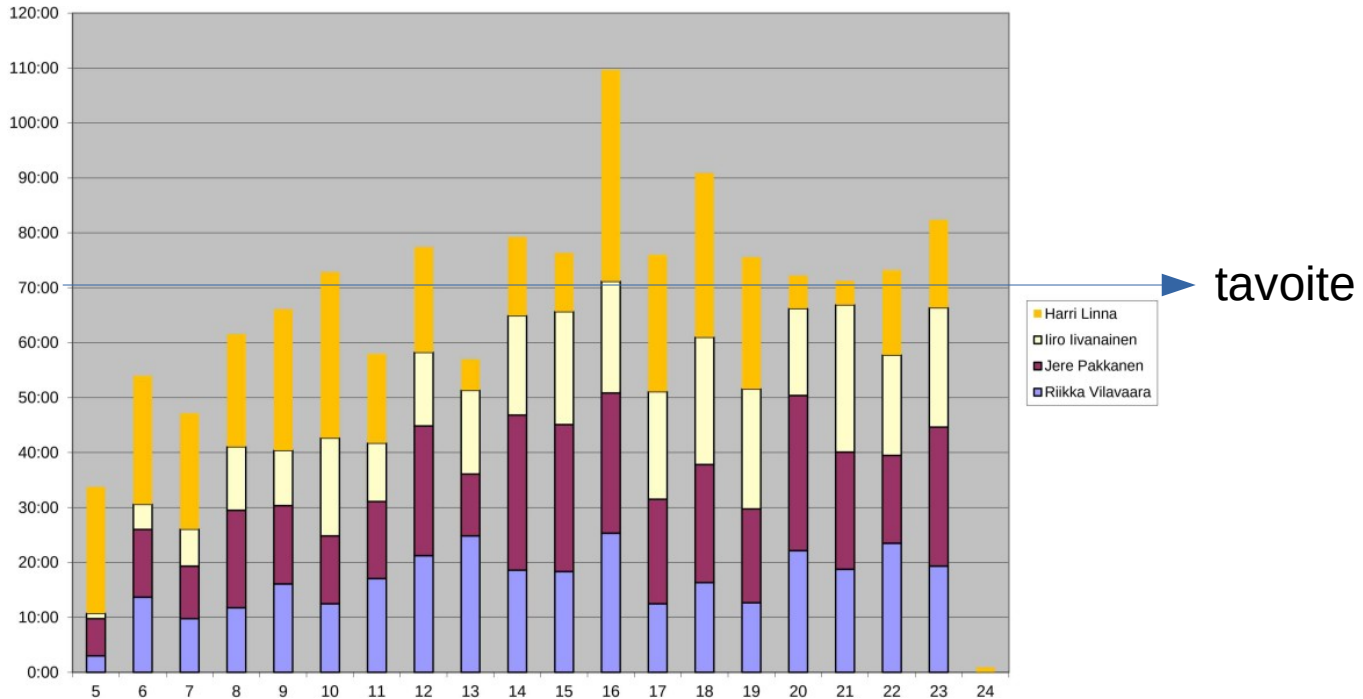

Projektiaikataulu

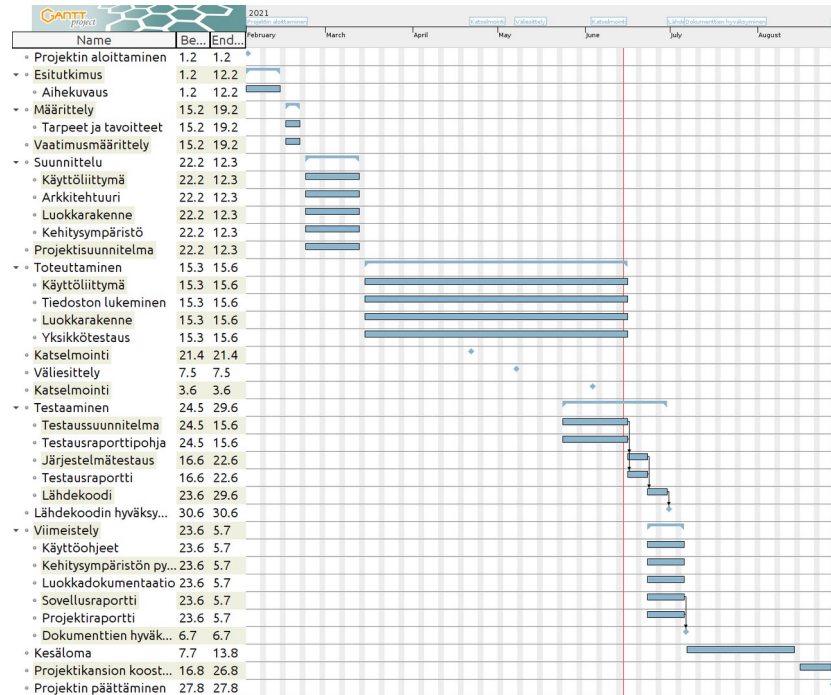

Projektiaikataulu

Maantain 14.6 aikana

- lähetetään sovelluksen 4. prototyyppi ja
- lähetetään selvitys vaatimusten tilasta.

Keskiviikkona 16.6 aloitetaan testausvaihe.
