

Tilakatsaus viikko 26

Groundhog

Ma 28.6.2021

Tehdyt toimenpiteet

Dokumentit

- Testaussuunitelma 0.3.3
- Testausraportti 0.1.0
- Sovellusraportti 0.1.0

Ohjelma

- Lisättiin Connectors-listan pikavalikkoon Go To -toiminto
- Lisättiin indikaattori kuvapinojen luomisesta, kun operaatio käynnissä.
- Toteutettiin sovelluksen virheenkäsittely ja käsiteltiin Visual Studion varoitukset.

Seuraavat toimenpiteet

Toisen testauskerran suorittaminen Windows 10-käyttöjärjestelmällä.

Sovelluksen käyttöohjeen kirjoittaminen ja yhdistäminen F1-painikkeeseen.

Dokumenttien kirjoittaminen loppuun.

Aiemmin suunnitellut toimenpiteet

Tehty. Koodikatselmoinnissa ehdotettujen muutosten toteuttaminen erityisesti virheenkäsittelyn osalta.

Tehty. Indikaattori kuvapinojen luomisesta, kun operaatio käynnissä.

Tehty. Connectors-listan alkion valitseminen näyttää liitoskohdan karttakuvassa.


Tehty. Sovelluksen ensimmäisen testauskerran suorittaminen.

Tehty. Lähdekoodi jätettiin teknisen ohjaajan tarkastettavaksi.

Kohdattuja ongelmia

Ei juurikaan kohdattuja ongelmia.


Ajankäyttö vaiheittain

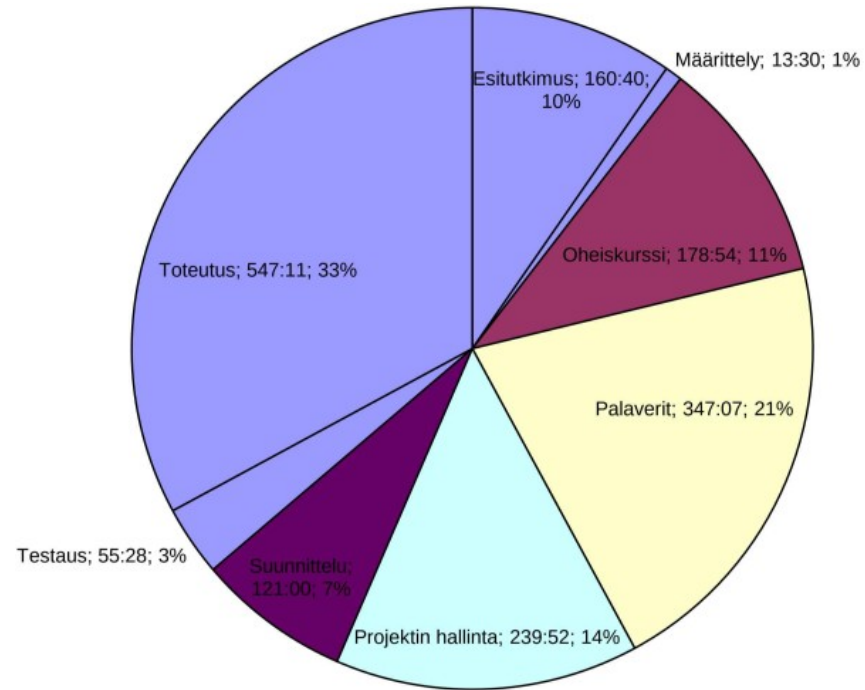


Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

Viikko		(Kaikki)			
Ajankäyttö	Tekijä				
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä
Esitutkimus	37:15	28:15	62:10	33:00	160:40
Määrittely		7:00		6:30	13:30
Oheiskurssi	47:20	45:14	34:15	52:05	178:54
Palaverit	87:00	98:40	73:00	88:27	347:07
Projektin hallinta	80:35	30:08	48:25	80:44	239:52
Suunnittelu	12:25	37:00	3:00	68:35	121:00
Testaus	2:10		30:55	22:23	55:28
Toteutus	138:35	183:42	123:25	101:29	547:11
Yhteensä	405:20	429:59	375:10	453:13	1663:42

Ajankäyttö viikoittain

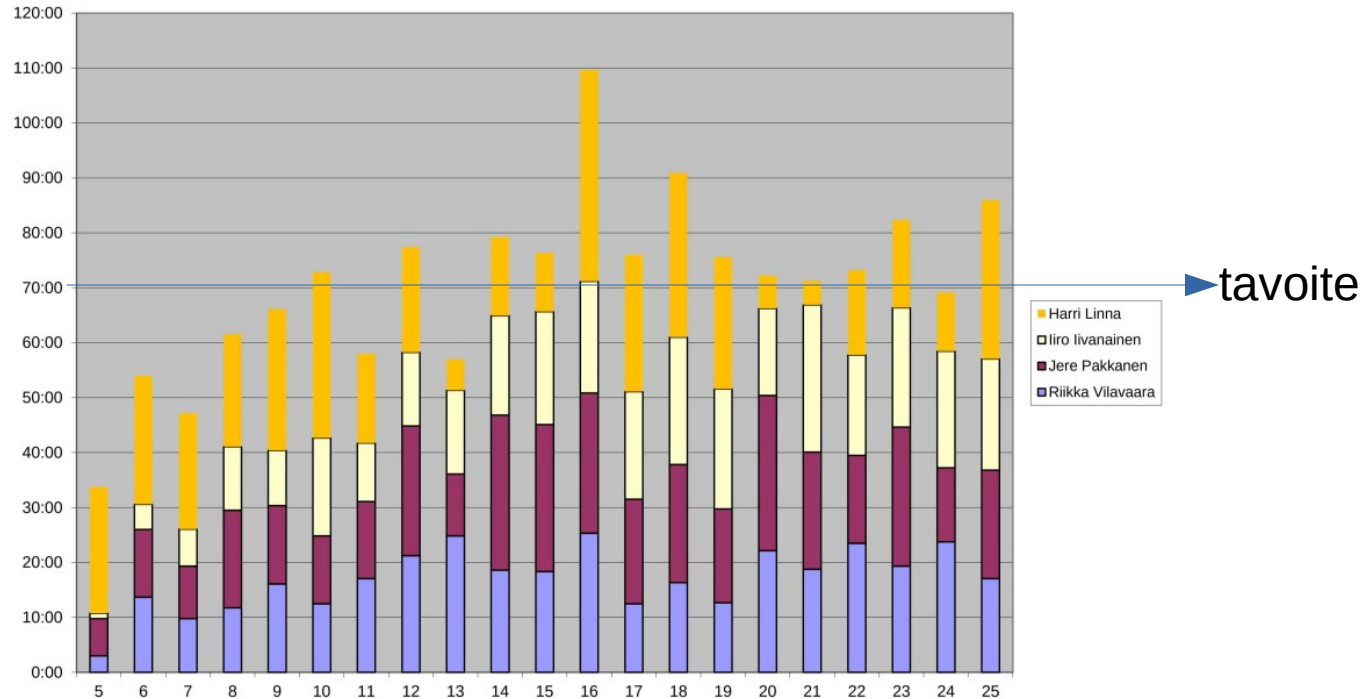

Projektiaikataulu

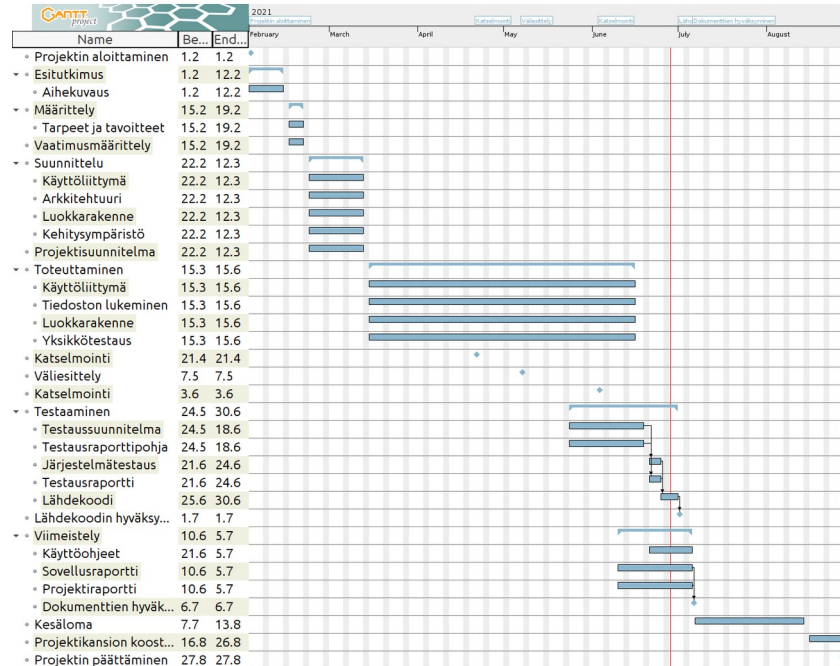

Projektiaikataulu

Aikataulussa. Maanantaina 21.6 aloitettiin testausvaihe, jonka ensimmäinen testauskerta kesti 24.6 asti. Korjaukset tehtiin jo samalla viikolla 25.6 mennessä.

Aikataulussa. Kaikki toteutettavaksi sovitut vaatimukset on toteutettu ja lähdekoodi on jätetty teknisen ohjaajan tarkastettavaksi 28.6 mennessä.

Maanantaina 28.6 aloitetaan toisen testauskerran suorittaminen, jonka arvioidaan valmistuvan ja raportoitavan 30.6 mennessä.

Raporttien ensimmäisten valmiiden tekstiversioiden tarkastettavaksi jättäminen tapahtuu todennäköisesti heinäkuun alussa viikolla 27.
