

Tilakatsaus viikko 27

Groundhog

Ti 6.7.2021

Tehdyt toimenpiteet

Dokumentit

- Käyttöliittymäsuunnitelma 0.5.0
- Arkkitehtuurisuunnitelma 0.3.0
- Luokkasuunnitelma 0.2.0
- Vaatimusmäärittely 0.5.0
- Testaussuunnitelma 0.5.0
- Testausraportti 0.2.0
- Sovellusraportti 0.1.0

Ohjelma

- Tehtiin toisen testauskerran kommenttien muutokset.
- Tehtiin teknisen ohjaajan hyväksymistarkistuksen palautteen muutokset.

Seuraavat toimenpiteet

Projektia edistetään parhaiten keskittymällä keskeneräisiin toimenpiteisiin, joten tällä hetkellä ei juurikaan uusia toimenpiteitä.

Aiemmin suunnitellut toimenpiteet

Tehty. Toisen testauskerran suorittaminen Windows 10 -käyttöjärjestelmällä.

Kesken. Sovelluksen käyttöohjeen kirjoittaminen ja yhdistäminen F1-painikkeeseen.

Kesken. Dokumenttien kirjoittaminen loppuun.

Kohdattuja ongelmia


Palaverin 22.6 muistio on kadonnut.

- Pöytäkirja julkistetaan ennen palaveria 15.7.

Versiohallinnan omistajuutta ei kyetty siirtämään GitLab-palvelun rajoitusten vuoksi.

- **Ratkaistu.** Voidaan siirtää ylläpitäjän oikeudet.


Ajankäyttö vaiheittain

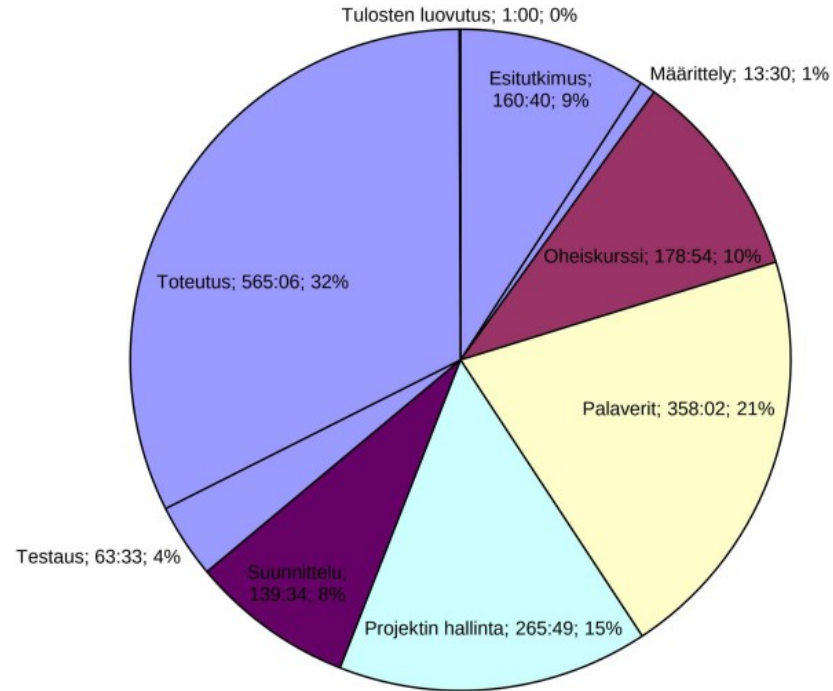


Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

Viikko		(Kaikki)				
Ajankäyttö	Tekijä					
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä	
Esitutkimus	37:15	28:15	62:10	33:00	160:40	
Määrittely		7:00		6:30	13:30	
Oheiskurssi	47:20	45:14	34:15	52:05	178:54	
Palaverit	89:05	100:30	78:45	89:42	358:02	
Projektin hallinta	87:00	30:38	48:25	99:46	265:49	
Suunnittelu	12:25	37:00	3:00	87:09	139:34	
Testaus	2:10		39:00	22:23	63:33	
Toteutus	146:00	189:42	127:55	101:29	565:06	
Tulosten luovutus				1:00	1:00	
Yhteensä	421:15	438:19	393:30	493:04	1746:08	

Ajankäyttö viikoittain

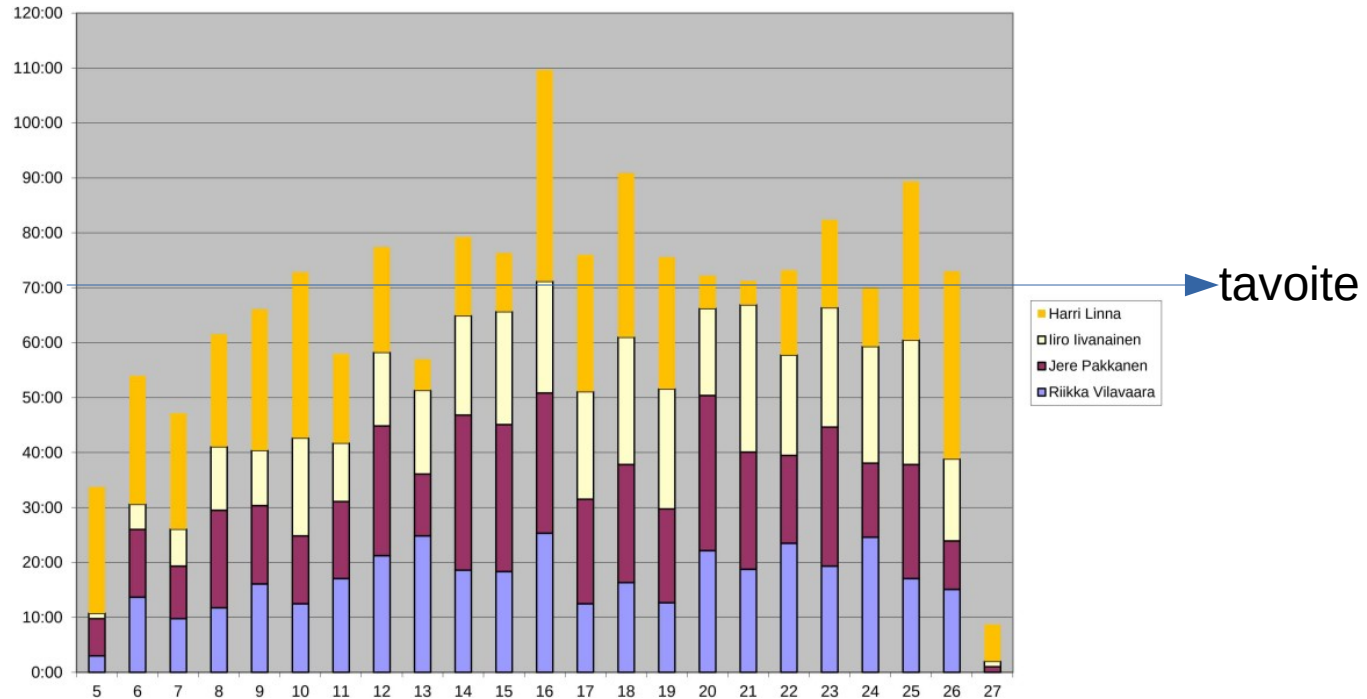

Projektiaikataulu

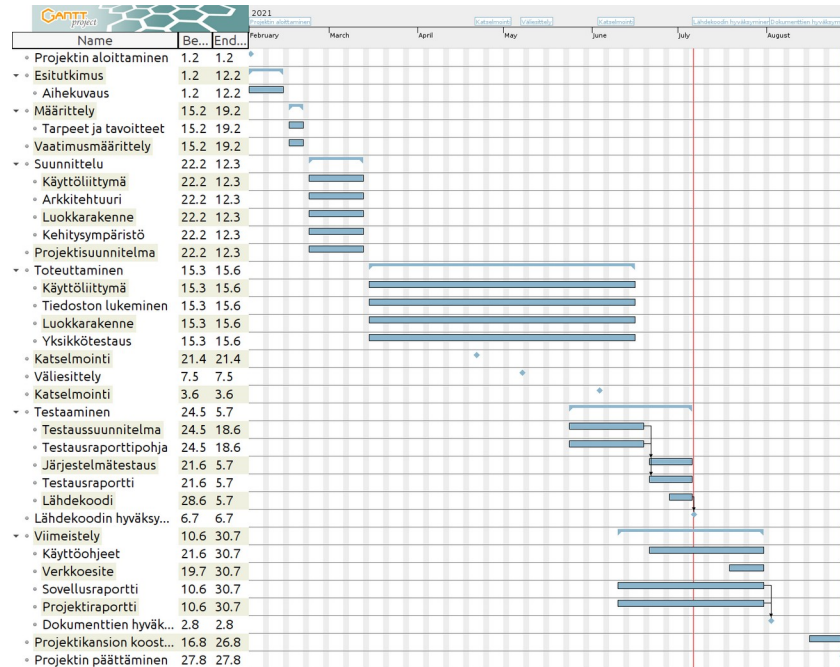

Projektiaikataulu

Maanantaina 28.6 aloittiin toisen testauskerran suorittaminen, joka valmistui ja raportoitiin 2.7. Toisen testauskerran raportin virheet saatiin korjattua 5.7 mennessä.

Sovellus luovutettiin teknisen ohjaajan tarkistettavaksi 28.6. Tarkistuksen jälkeen lähdekoodi hyväksyttiin korjauksilla 29.6. Hyväksyntätarkistuksen korjattavat asiat saatiin korjattua 5.7.

Projektin testausvaihe päättyi lähdekoodin hyväksymiseen, jonka jälkeen projekti siirtyi viimeistelyvaiheeseen. Viimeistelyvaihe kestää projektin päättymiseen asti eli viimeistään 31.8.

Myöhässä. Raporttien ensimmäiset tekstiversiot eivät ehtineet vastaavan ohjaajan tarkastettavaksi viikon 27 alkuun mennessä. Tavoitteena on hyväksyttää jokainen projektin tuloksista viimeistään elokuun aikana.
