

# TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko II

18.3.2019

## TEHDYT TOIMENPITEET

- Etusivun toteutusta jatkettu
  - Analysoinnin tai observoinnin valinta julkiselle käyttäjälle
- Taustaohjelmiston toteutusta jatkettu
- Kategorian määrittelysivun toteutus aloitettu
- Hallintasivun toteutus aloitettu
- Palauteanalyysisivu aloitettu
- Vaatimuslistaa jatkettu
- Projektisuunnitelma julkaistu projektiorganisaatiolle

# TULEVAT TOIMENPITEET

- Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- Koodaus
  - Taustaohjelmisto
  - Tietokanta
  - Kategorian määrittelysivu
  - Palauteanalyysisivu
  - Etusivu
  - Hallintasivu

## KEHITYSVAIHE I, VKO 9-11


- Aloitimme kaikki kehitysvaiheeseen I kuuluvat toimenpiteet
- Etusivu lähes valmis
- Kategorian määrittelysivu lähes valmis, odottaa tietokannan valmistumista
- Projektisuunnitelma lähes valmis
- Hallintasivun toteutus aloitettu suunniteltua aikaisemmin

## KEHITYSVAIHE 2, VKO 12-14

- Taustaohjelmisto
- Tietokanta, valmiiksi vko 14
- Kategorian määrittelysivu, valmiiksi vko 13
- Palauteanalyysisivu, valmiiksi vko 13
- Etusivu, valmiiksi vko 13
- Yhteenvetosivu
- Hallintasivu
- I. väliesittely 2.4.2019
- I. katselmointi


# AJANKÄYTTÖ VAIHEITTAIN

Ajankäyttö vaiheittain

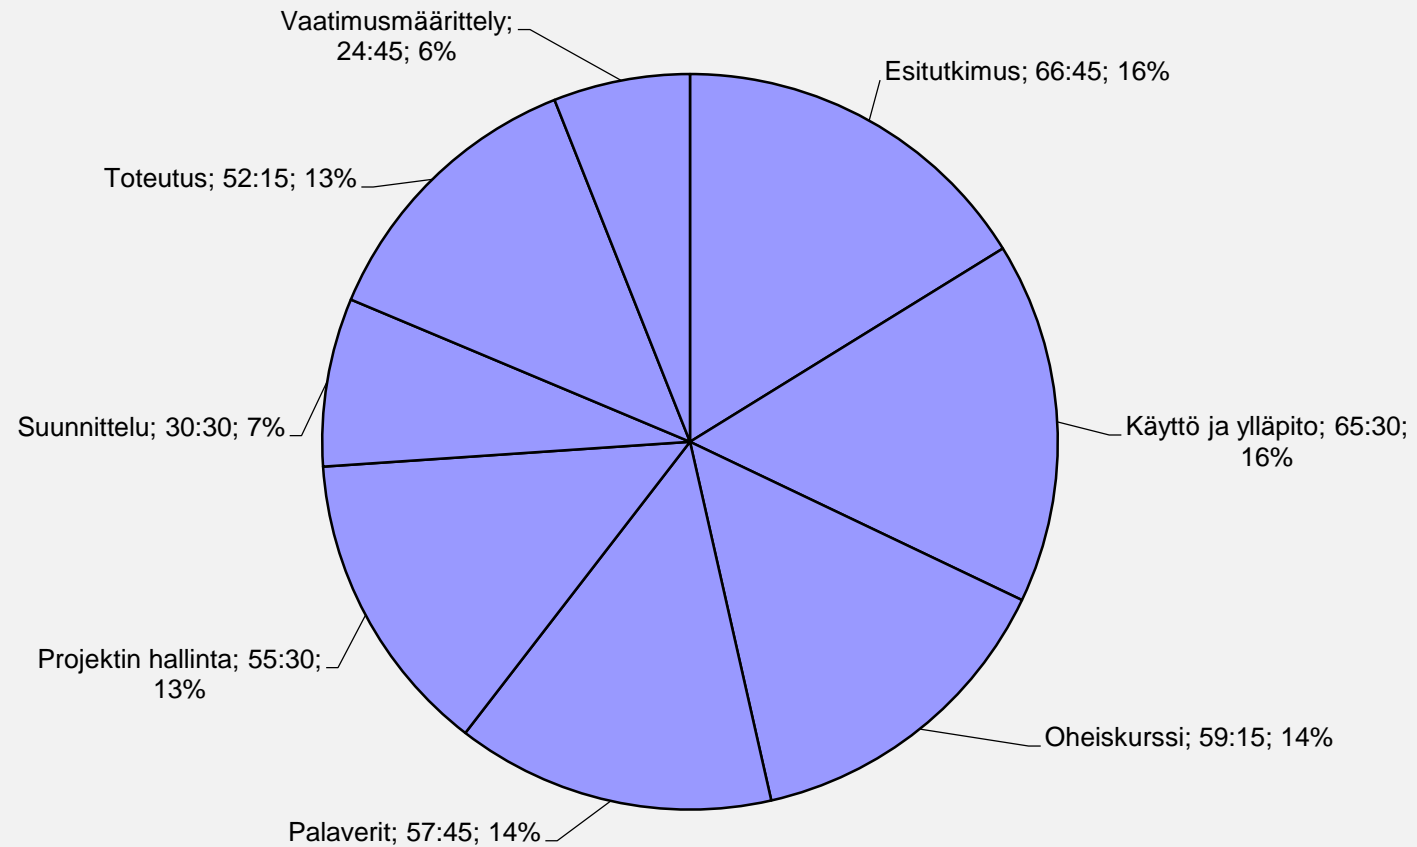

# AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO II

Ajankäyttö viikoittain

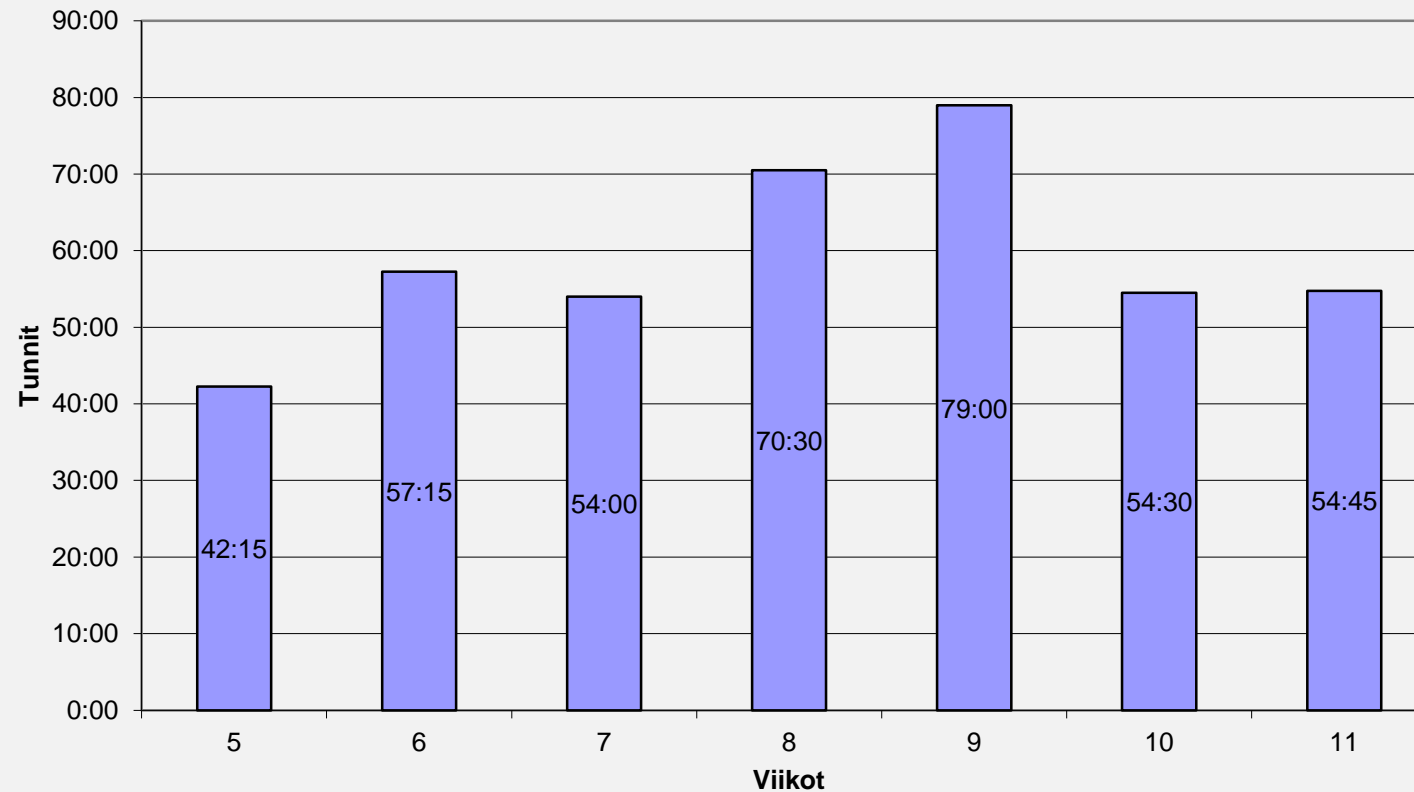

# JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	6:15	13:00	10:00	13:00	42:15
6	16:15	14:15	10:15	16:30	57:15
7	14:45	14:00	10:00	15:15	54:00
8	21:30	13:15	18:45	17:00	70:30
9	15:15	20:45	19:15	20:45	76:00
10	13:30	12:45	19:30	8:45	54:25
11	16:30	0	21:30	16:45	49:15
Kaikki yhteensä	104:00	88:00	112:15	108:00	412:15
