

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 13

1.4.2019

TEHDYT TOIMENPITEET

- Taustaohjelmiston ja tietokannan toteutusta jatkettu
- Palauteanalyysisivun toteutusta jatkettu
- Observoinnin yhteenvedon tallennus kuvatiedostoksi
- Yhteenvetosivun toteutus aloitettu
- Väliesittely tehty
- Järjestelmätestaussuunnitelmaa aloitettu
- Projektisuunnitelma korjattu


TULEVAT TOIMENPITEET

- Väliesittely 2.4.2019
- I. katselmointi 3.4.2019
- Koodaus
 - Taustaohjelmisto
 - Tietokanta
 - Palauteanalyysisivu
 - Hallintasivu
 - Raporttisivu
 - Yhteenvetosivu

KOHDATTUJA VAIKEUKSIA


- Palauteanalyysisivulle yritettiin tehdä toteutus yhtenevästi Moveatiksen lähdekoodin kanssa, mutta toteutus ei toiminut
- Moveatis oli luonut painikkeet div-elementteinä ja määrittänyt niille koodissa ominaisuudet. Moveo yritti tehdä samalla tavalla, mutta se ei toiminut millään tasolla. Päädyttiin käyttämään primeface-komponentteja.

AJANKÄYTTÖ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSITTAIN

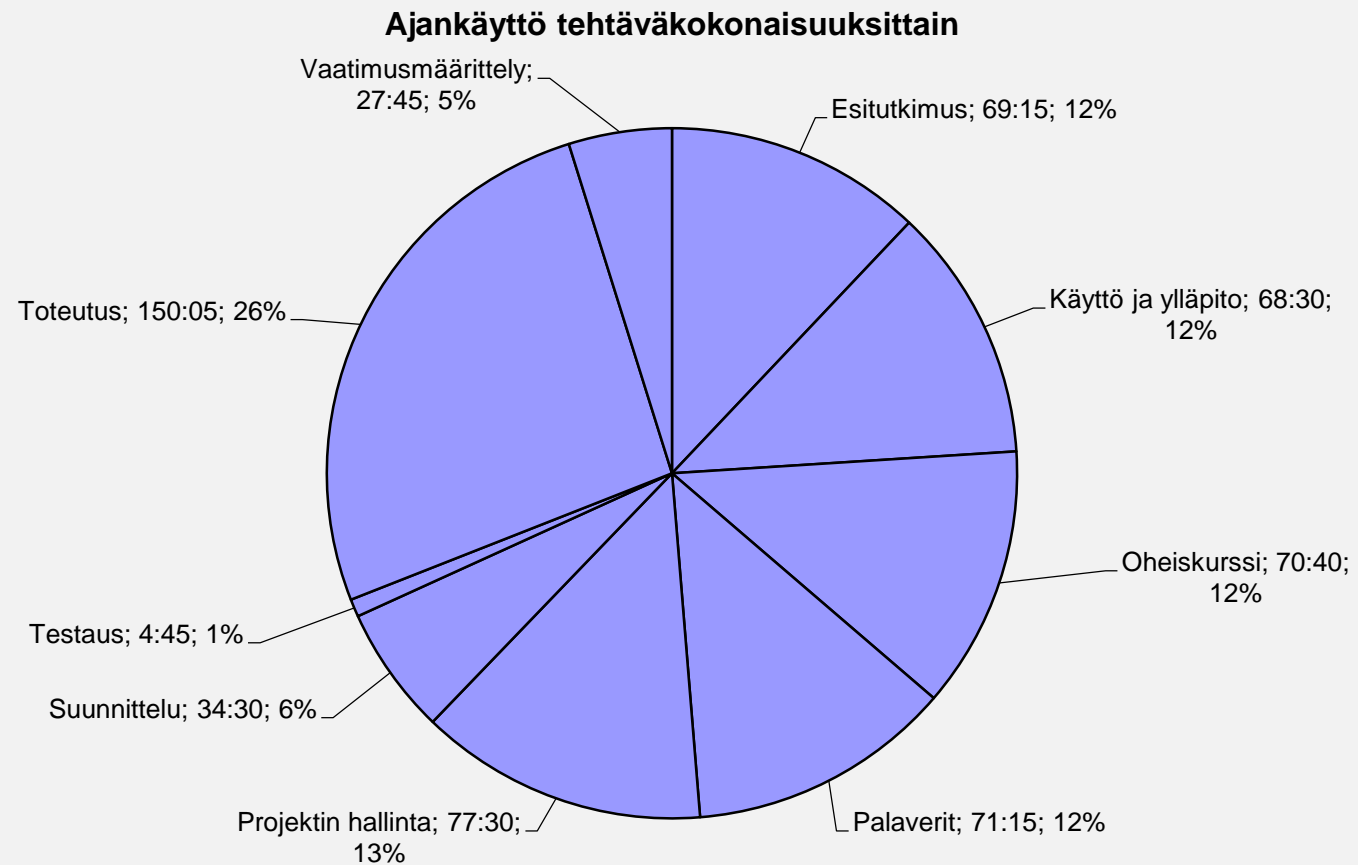

AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 13

Ajankäyttö viikoittain

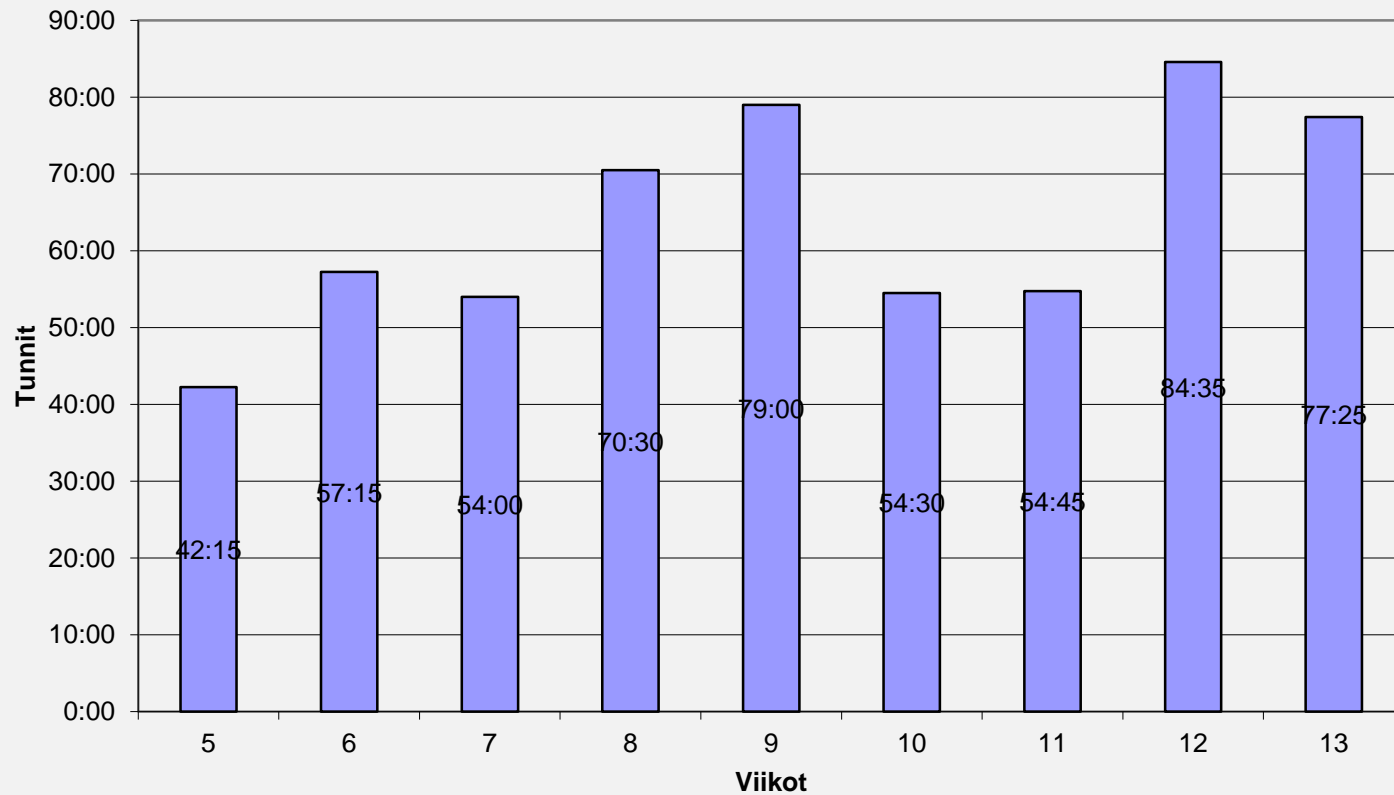

JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	6:15	13:00	10:00	13:00	42:15
6	16:15	14:15	10:15	16:30	57:15
7	14:45	14:00	10:00	15:15	54:00
8	21:30	13:15	18:45	17:00	70:30
9	15:15	20:45	19:15	20:45	76:00
10	13:30	12:45	19:30	8:45	54:25
11	16:30	0	21:30	16:45	54:45
12	15:00	19:25	30:45	19:25	84:35
13	16:45	22:40	17:45	20:15	77:25
Kaikki yhteensä	135:45	130:05	160:45	147:40	574:15
