
Tilakatsaus 10.6.2021

1. Edistys edellisen tilakatsauksen jälkeen

1.1 Hannamari

Hannamari on

- tehnyt korjauksia TIM-viesteihin,
- tehnyt palvelintestin TIM-viestien kohdesivujen URLien tarkistukseen,
- tehnyt projektin esittelysivun,
- kirjoittanut sovellusraporttia,
- päivittänyt vaatimusmäärittelyä.

1.2 Kristian

Kristian on

- suorittanut toisen toiminnallisen testauskerran,
- kirjoittanut toisen testausraportin.

1.3 Tomi

Tomi on

- viimeistellyt ja korjannut koodia,
- tehnyt palvelintestin viestilistan luomiseen,
- kirjoittanut käyttöohjeet,
- koonnut GitLab-korttiin jatkokehitykseen sovitut asiat.

1.4 Tuuli

Tuuli on

- tehnyt korjauksia TIM-viesteihin,
- tehnyt palvelintestin TIM-viestin lähetykseen,
- kirjoittanut ja toimittanut projektiraportin ensimmäisen version,
- noutanut projektikansioon liittyvät materiaalit.

2. Projektin tulokset

2.1 Dokumentit

Tulos	Tila
Projektisuunnitelma	hyväksytty
Vaatimusmäärittely	hyväksytty
Testaussuunnitelma	kesken
Testausraportit	kesken
Projektiraportti	kesken
Sovellusraportti	kesken
Käyttöohjeet	kesken


2.2 Ohjelmaosat

Tulos	Tila
Sähköpostilistat	toteutettu
Sähköpostiarkistot	toteutettu
Viestilistat	toteutettu
Viestiarkistot	toteutettu
Viestilistojen asetukset	toteutettu
TIM-viestit	toteutettu
Viestintäintegraatio	ei projektissa

3. Seuraavat toimenpiteet

Projektipalavereja ei enää pidetä, ellei palaverille ole erityistä tarvetta. Ennen projektin loppua ryhmä viimeistelee ja hyväksyttää loput tulokset ja kokoaa ne luovutusta varten.

4. Jäsenten työtunnit

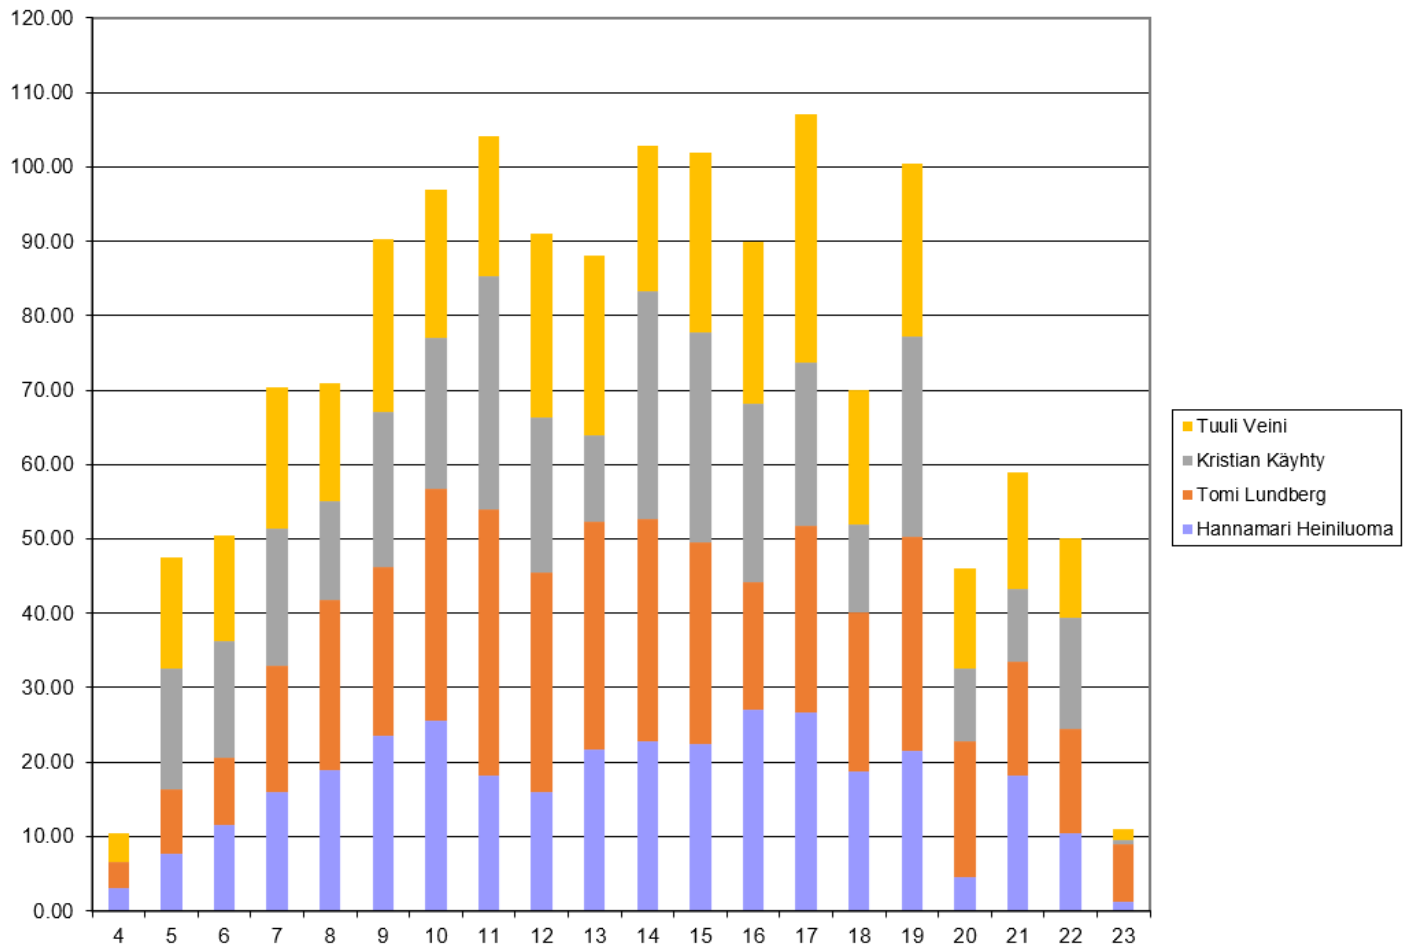


Kuva 1. Jäsenten työtunnit viikoilla 4-23. Kaavioon ei sisälly oheiskurssien tunteja.

Aika	Tekijä				Grand Total
Viikko	Hannamari Heiniluoma	Tomi Lundberg	Kristian Käyhty	Tuuli Veini	Grand Total
4	3.00	3.30		4.00	10.30
5	7.45	8.30	16.19	15.00	47.34
6	11.30	9.00	15.42	14.15	50.27
7	16.00	17.00	18.23	19.00	70.23
8	19.00	22.45	13.15	16.00	71.00
9	23.30	22.45	20.45	23.15	90.15
10	25.30	31.15	20.20	19.45	96.50
11	18.15	35.45	31.23	18.45	104.08
12	16.00	29.30	20.45	24.45	91.00
13	21.45	30.30	11.45	24.00	88.00
14	22.45	30.00	30.30	19.30	102.45
15	22.30	27.00	28.10	24.15	101.55
16	27.00	17.15	23.58	21.45	89.58
17	26.45	25.00	22.01	33.15	107.01
18	18.45	21.25	11.45	18.00	69.55

19	21.30	28.45	26.55	23.16	100.26
20	4.30	18.15	9.52	13.30	46.07
21	18.15	15.15	9.47	15.35	58.52
22	10.30	14.00	14.53	10.45	50.08
23	1.15	7.45	0.31	1.30	11.01
Grand Total	336.00	415.10	346.59	360.06	1458.15

Taulukko 1. Jäsenten työtunnit viikoilla 4-23. Taulukkoon ei sisälly oheiskurssien tunteja.

Tomilla on projektin lopussa tehtynä 50-80 työtuntia muita enemmän. Tomi viimeistelee projektiin vielä käyttöohjeet. Hannamari viimeistelee sovellusraportin ja Kristian korjaa testausdokumentteja. Tuuli viimeistelee projektiraportin ja kokoaa tulokset.

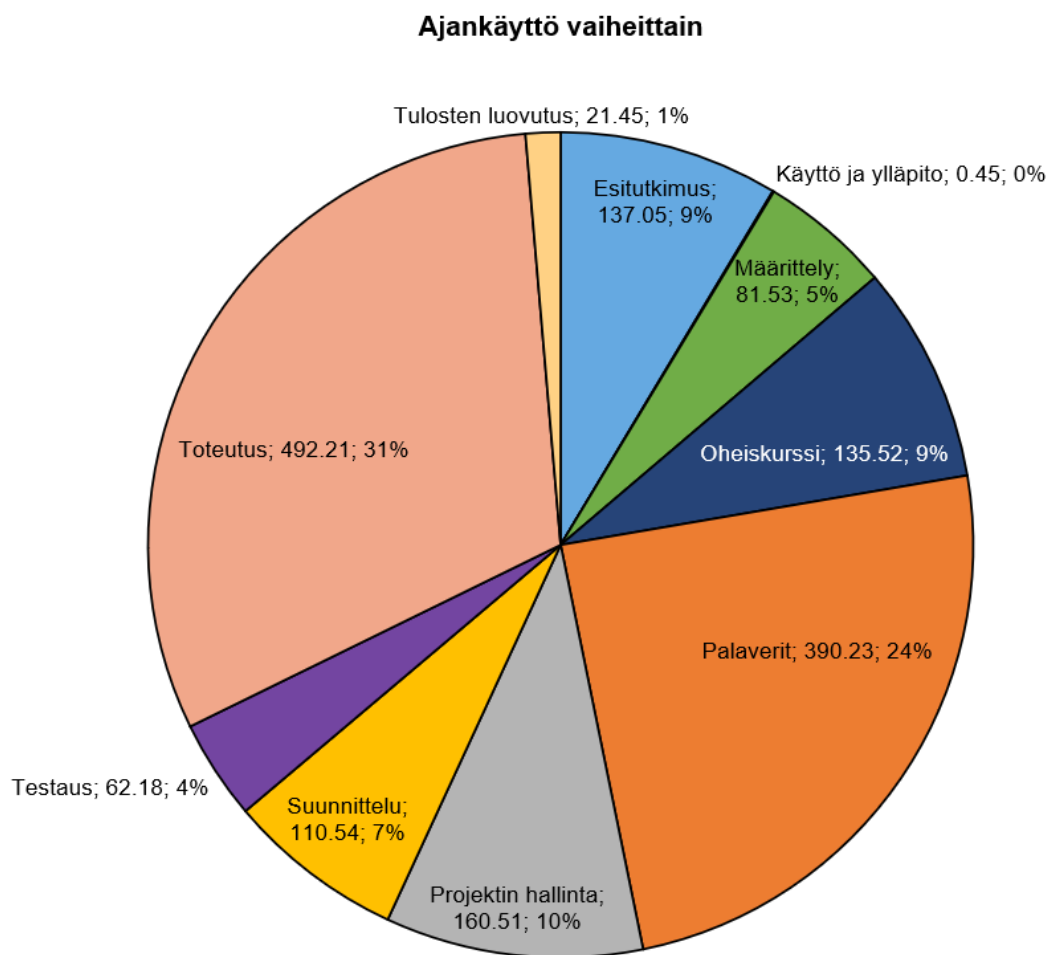

Kuva 2. Työtunnit tehtäväkokonaisuuksittain viikoilta 4-23.

5. Tulosten ja tehtävien aikataulu

Projekti on venynyt alkuperäisen aikataulun viimeisestä päättymispäivästä tähän mennessä 1,5 viikkoa. Ryhmän täytyy vielä viimeistellä ja hyväksyttää kesken olevat

dokumentit ja koota tulokset.

6. Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Kaikkien jäsenten työt ovat vieneen aikaa projektilta.

7. Projektia edistävät päätökset ja toimenpiteet

Ryhmän tulee viimeistellä dokumentit ja toimittaa ne tarkastettavaksi mahdollisimman pian.

Sovellukselle ja vaatimusmäärittelydokumentille tarvitaan tilaajan edustajan hyväksyntä tai korjauspyynnöt.
